



**SİVAS
BİLİM VE TEKNOLOJİ
ÜNİVERSİTESİ**

2021 YILI KAMU YATIRIMLARI

İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU



sivasbtu



sivas.btu



sivasbtu



sivasbtu

A. GENEL BİLGİLER	6
A.1. Misyon, Vizyon ve Temel Değerler	6
A.2. Kuruluş Tarihçesi	7
A.3. Taşınmaz Alanlar	10
A.4. Öğrenci Sayıları	10
A.5. Personel Sayıları	11
A.6. Örgüt Yapısı	13
B. KURULUŞUN FİNANSMAN KAYNAKLARI	14
B.1. Bütçe Gelirleri	14
B.2. Kuruluşun Yatırım Programı Proje Finansman Kaynakları	15
B.3. Bütçe Giderleri	17
C. 2021 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLenen VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI	22
D. YATIRIM PROJE UYGULAMALARI	25
D.1. Devam Eden Projeler	29
D.2. Tamamlanan Projeler	32
E. YATIRIM PROJE UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÖNERİLER	41


TABLolar DİZİNİ

Tablo 1:	Akademik Birimlerin Kuruluş Kronolojisi	7
Tablo 2:	Taşınmaz Alanlar	10
Tablo 3:	Öğrenci Sayıları	10
Tablo 4:	Akademik Personel	11
Tablo 5:	İdari Personel	12
Tablo 6:	Bütçe Gelirleri	14
Tablo 7:	Yatırım Programı Proje Finansman Kaynakları	16
Tablo 8:	Personel Giderleri	17
Tablo 9:	Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Prim Giderleri	18
Tablo 10:	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	19
Tablo 11:	Cari Transferler	20
Tablo 12:	Sermaye Giderleri	21
Tablo 13:	Yatırım Projeleri	25
Tablo 14:	Yatırım Harcamaları (Ekonomik iki düzeyde)	26
Tablo 15:	06.1 Yatırım Harcamaları (Ekonomik Kod Dört Düzeyde)	27
Tablo 16:	06.3 Yatırım Harcamaları (Ekonomik Kod Dört Düzeyde)	27
Tablo 17:	06.5 Yatırım Harcamaları (Ekonomik Kod Dört Düzeyde)	28
Tablo 18:	06.7 Yatırım Harcamaları (Ekonomik Kod Dört Düzeyde)	28

Tablo 19:	Derslik ve Merkezi Birimler	29
Tablo 20:	Kampüs Altyapısı	31
Tablo 21:	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	32
Tablo 22:	Muhtelif İşler (Büyük Onarım)	33
Tablo 23:	Muhtelif İşler (Makine- Teçhizat)	34
Tablo 24:	Muhtelif İşler (Yazılım)	36
Tablo 25:	Bilgi Yönetim Sistemi	37
Tablo 26:	Yayın Alımları	39

GRAFİK DİZİNİ

Grafik 1:	Akademik Personel	11
Grafik 2:	İdari Personel	12
Grafik 3:	2021 Yılı Bütçe Gelir Durumu	14
Grafik 4:	2021 Yılı Yatırım Programı Proje Finansman Kaynak Dağılım Oranı	15
Grafik 5:	Personel Giderleri	17
Grafik 6:	Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Primi Giderleri	18
Grafik 7:	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	19
Grafik 8:	Cari Transferler	20
Grafik 9:	Sermaye Giderleri	21
Grafik 10:	Yatırım Harcama Oranları	26

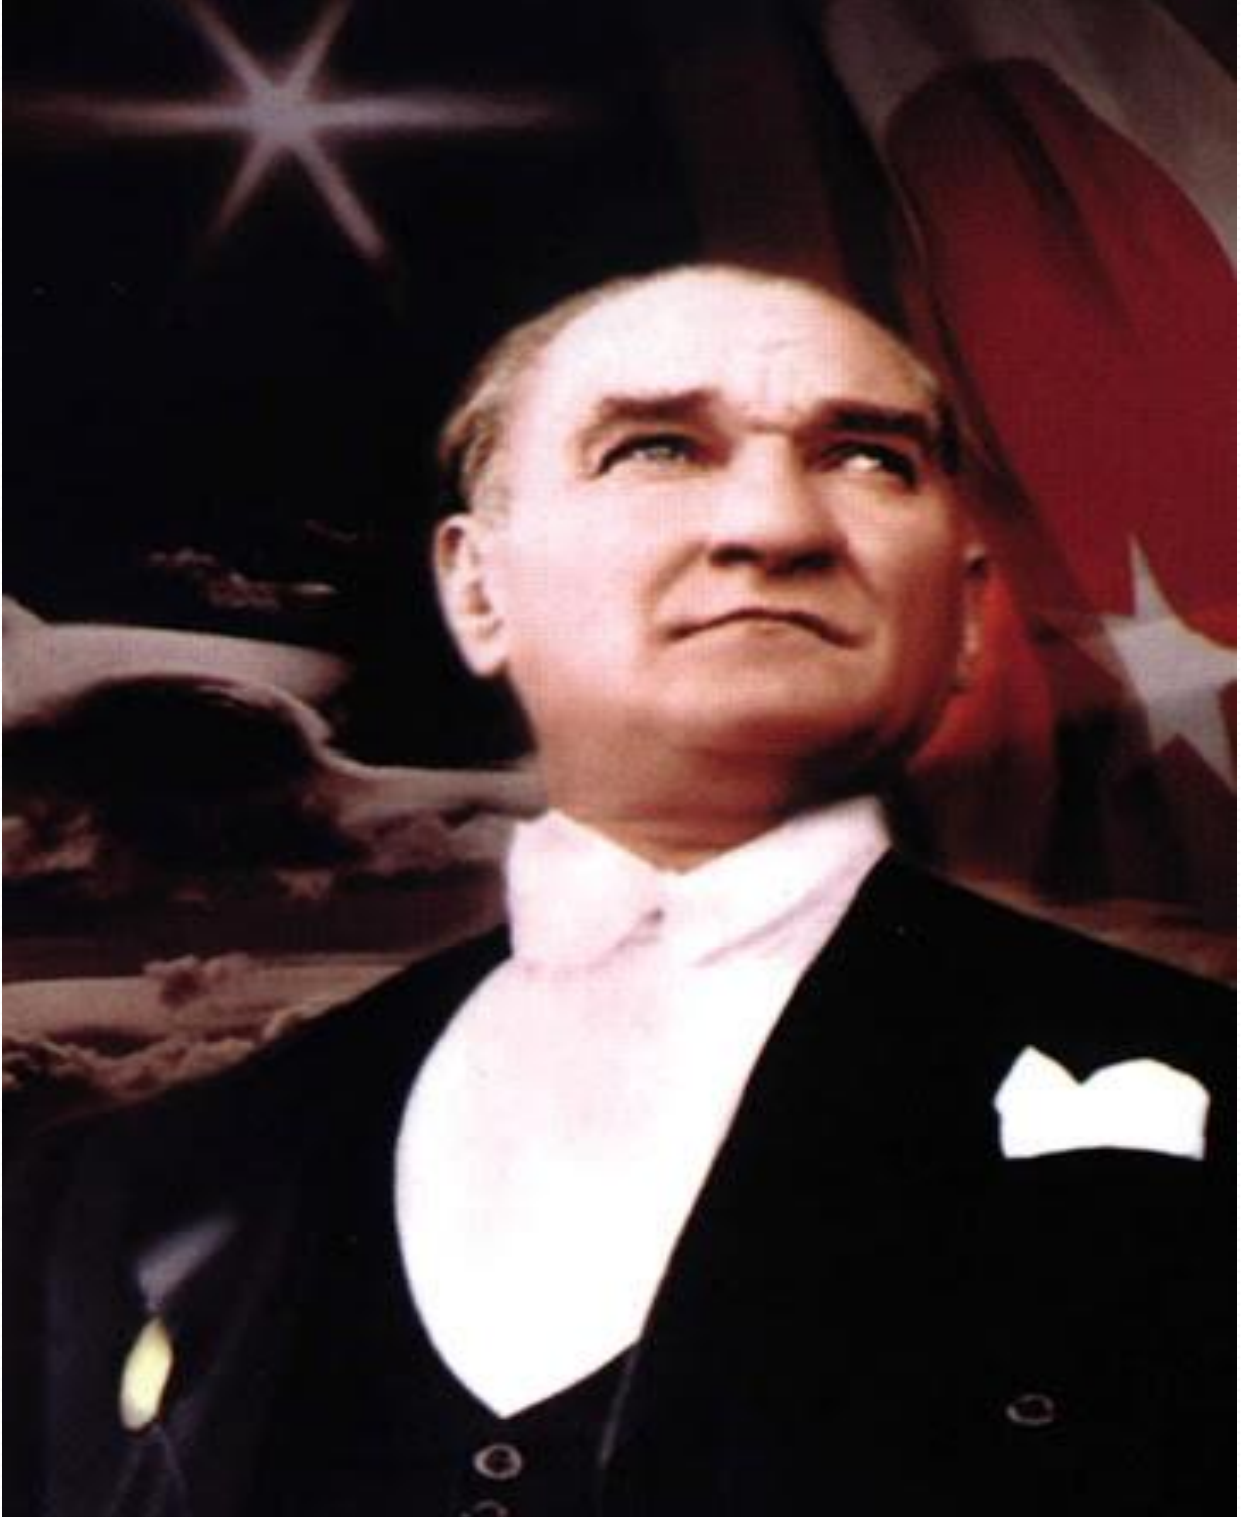

Hissiyatı ve vicdanı telakkiyatı, ilim ve fenle besleyip eğiterek toplumun gerçek huzur ve saadetine çalışmak ulvi bir görüştür.

K. Atatürk

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Üniversitemiz Mayıs 2018 yılında ekleme/bölünme olmaksızın kurulan araştırma odaklı bir üniversitedir. Kuruluş çalışmaları 2019 yılı itibari ile başlamış olup, yatırım programına 2019 yılı mayıs ayı itibariyle alınmıştır. 2021 yılında eğitim sektöründe 6 adet projesi bulunmakta olup, mevcut yatırım harcamalarının % 61’lik kısmı üniversitemiz için öncelikli ihtiyaç haline gelen “Derslik ve Merkezi Birimler Projesi” kapsamında harcanmıştır. Yatırım Programına alınan projeler bazında ödenek üstü harcama yapılmamıştır.

Üniversitemizin 2021 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu, 5018 sayılı Kanun’un 25’inci ve 60’ıncı maddeleri ile 5436 sayılı Kanun’un 15’inci maddesine dayanılarak hazırlanan “Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin” 24’üncü maddesi uyarınca hesap verilebilirliği sağlamak ve yatırım harcamalarımızın verimliliğinin kontrol edilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Raporun hazırlanmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, raporu paydaşlarımız ve kamuoyuna saygılarımla sunarım.

Prof. Dr. Mehmet KUL

Rektör

A. GENEL BİLGİLER**A.1. Misyon, Vizyon ve Temel Değerler****❖ MİSYON**

Uygulamalı özgün programlarla donanımlı bireyler yetiştiren, yerel ve küresel düzeyde topluma katkı sağlayan, savunma teknolojileri ve tarım bilimleri başta olmak üzere mühendislik alanlarında ileri teknoloji üreten ve geliştiren; temel değerlere ve bilimin evrensel ilkelerine bağlı, girişimci yeni nesil bir üniversitedir.

❖ VİZYON

Yükseköğretim alanında ve üniversite-sanayi iş birliğinde yenilikçi yaklaşımlarla, akademik birikimi sektöre aktararak bilgiyi ürüne dönüştüren, uluslararası saygınlığa sahip araştırma üniversitesi olmaktır.

❖ TEMEL DEĞERLER

- ✓ Kurumsal aidiyete önem verir,
- ✓ Muasır medeniyetler seviyesine çıkma, hatta onu aşma ilkesine bağlı,
- ✓ Evrensel değerlere bağlı,
- ✓ Milli manevi değerleri temel alan,
- ✓ Fırsat eşitliğine önem veren, farklılıklara karşı hoşgörülü,
- ✓ İnsana ve doğaya duyarlı, sosyal sorumluluk bilincini önemseyen,
- ✓ Tüm süreçlerde yenilikçi yaklaşımlarla kalite odaklı olmayı esas alan,
- ✓ Ulusal ve uluslararası paydaşlarla işbirliğine önem veren, rekabetçi ve girişimci,
- ✓ Katılımcı şeffaf ve hesap verebilirlik ilkelerini esas alan yönetim anlayışı

A.2. Kuruluş Tarihçesi

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’ de 7141 sayılı Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında kurulan 16 Üniversite arasında hiçbir üniversiteden bölünme/eklenme olmaksızın kurulan iki yeni Üniversiteden biridir. İlgili Kanunla Üniversitemizde 3 Fakülte, 1 Yabancı Diller Yüksekokulu, 1 Meslek Yüksekokulu ve 1 Enstitü kurulmuş, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN’ ın tensipleriyle Rektör ataması 27 Aralık 2018 tarihinde yapılmış ve kuruluş çalışmaları 2019 Ocak ayı itibarıyla başlamıştır.

Üniversitemiz fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve bölümlerine ait kuruluş tarihleri aşağıda ki tabloda verilmiştir.

Tablo 1: Akademik Birimlerin Kuruluş Kronolojisi

BİRİM ADI	AÇILIŞ TARİHİ	AÇILIŞ ŞEKLİ
SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ	18.05.2018	30425 sayılı Resmi Gazete
HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ	18.05.2018	30425 sayılı Resmi Gazete
UZAY MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ	22.05.2019	YÖK Genel Kurulu Kararı İle
UÇAK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ	22.05.2019	YÖK Genel Kurulu Kararı İle
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ	18.05.2018	30425 sayılı Resmi Gazete
SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ (DİSİPLİNLERARASI) (DR)	22.01.2020	YÖK Genel Kurulu Kararı İle
SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ (YL) (TEZLİ)	22.01.2020	YÖK Genel Kurulu Kararı İle
TARIM BİLİMLERİ (YL) (TEZLİ)	08.07.2020	YÖK Genel Kurulu Kararı İle
BİTKİ KORUMA (DR)	20.01.2021	YÖK Genel Kurulu Kararı İle
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ	18.05.2018	30425 sayılı Resmi Gazete

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ	24.04.2019	YÖK Genel Kurulu Kararı İle
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ	24.04.2019	YÖK Genel Kurulu Kararı İle
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ	29.05.2019	YÖK Genel Kurulu Kararı İle
MÜHENDİSLİK TEMEL BİLİMLERİ BÖLÜMÜ	22.05.2019	YÖK Genel Kurulu Kararı İle
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ	29.05.2019	YÖK Genel Kurulu Kararı İle
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ	06.11.2019	YÖK Genel Kurulu Kararı İle
SİVAS MESLEK YÜKSEKOKULU	18.05.2018	30425 sayılı Resmi Gazete
MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ	24.04.2019	YÖK Genel Kurulu Kararı İle
UÇAK TEKNOLOJİSİ PR.	24.04.2019	YÖK Genel Kurulu Kararı İle
TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ	18.05.2018	30425 sayılı Resmi Gazete
BİTKİSEL ÜRETİM VE TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ	24.04.2019	YÖK Genel Kurulu Kararı İle
BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ	22.05.2019	YÖK Genel Kurulu Kararı İle
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU	18.05.2018	30425 sayılı Resmi Gazete
YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ	24.04.2019	YÖK Genel Kurulu Kararı İle

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bölüm ve anabilim dalları; Ülkemizin ve bölgemizin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, tüm dış paydaşlarımızın görüş ve önerileri neticesinde, temel mühendislik bilimleri yanı sıra üniversitemiz ihtisaslaşma alanı olarak belirlenen Savunma Sanayi sektörüne Ar-Ge hizmeti verecek, sektörün talep ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikli eleman ve araştırmacı

yetiştirecek şekilde ASELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE, TUBİTAK UZAY ve TUSAŞ-TAİ gibi alandaki lider savunma şirketleri ile bizzat istişare edilerek belirlenmiş, müfredat içerikleri ve program tasarımı süreci söz konusu kuruluşlarla tasarlanmaya devam etmektedir.

Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi ise, başta T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili birimleri olmak üzere kamu, özel gıda ve tarım alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla istişare ve iş birliği yapmak sureti ile bir tarım şehri olan Sivas'ta bölgenin ve ülkenin gıda ve tarımsal ürün anlamında kendine yeter ve dış piyasada rekabet edebilecek güce sahip olmak için çözümler üretecek bir Tarımsal Ar-Ge Merkezi olmaya adaydır.

Üniversitemiz, Merkezi Derslikler ve Birimleri inşaatı devam etmekte olup geçici hizmet binasında faaliyetlerine başlamıştır. Ancak, akademik, idari, alt yapı vb. kuruluş çalışmaları devam eden Üniversitemiz Lisans/Ön lisans düzeyinde eğitim- öğretim faaliyetlerine başlamış olmamasına rağmen Lisansüstü düzeyde eğitim – öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

2020 yılı bahar döneminde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde kurulan Savunma Teknolojileri Anabilim Dalında disiplinler arası Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programlarına öğrenci alımı gerçekleştirilmek suretiyle Üniversitemizde eğitim-öğretim lisansüstü düzeyde, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz döneminde de Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde Savunma Teknolojileri Anabilim Dalı tezli yüksek lisans ve doktora programları ile Tarım Bilimleri Anabilim Dalı Tezli yüksek lisans programında lisansüstü düzeyde eğitime başlamıştır.

2022 yılı nisan ayında fiziki altyapısının tamamlanmasıyla birlikte 2022-2023 eğitim öğretim döneminde Fakültelerimiz, Yüksekokulumuz ve Meslek Yüksekokulumuzda lisans/ön lisans programlarına öğrenci alımı gerçekleştirilecektir.

Rektörlük ve akademik ofisler ile laboratuvarlar Üniversitemiz yeni yerleşkesine taşınmaya kadar geçici olarak Cumhuriyet Teknokent kampüsü içinde bulunmaktadır. Üniversitemize tahsis edilen Sivas Fuar Eğitim ve Kongre alanında yapım işi başlayan Derslikler ve Merkezi Birimler Binasının bitmesiyle Üniversitemiz şehir merkezinde kendine ait kampüse taşınmış olacaktır. Kurtderesi Mevkiindeki 840 dönüm Merkez Kampüs alanı imar plan süreci devam etmektedir.

A.3. Taşınmaz Alanları

Tablo 2: Taşınmaz Alanlar

Yerleşkeler	Taşınmaz Alanların Dağılımı (m ²)	Kapalı Alanların Dağılımı (m ²)
	(Açık Alanlar)	
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlük Geçici Hizmet Binası	-	1.060 m ² (Cumhuriyet Teknokent bünyesinde geçici kullanım tahsisli)
Cumhuriyet Üniversitesi İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (CÜTAM)	-	1.000 m ² (Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde geçici kullanım tahsisli)
Laboratuvar (İŞGEM)	-	95 m ² (İŞGEM bünyesinde kiralık)
İleri Alaşımlar Üretim Merkezi (İŞGEM)	-	437,07 m ² (İŞGEM bünyesinde kiralık)
Akademik Ofisler (Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi)	-	603 m ² (Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde geçici kullanım tahsisli)
Lojman ve Üniversitenin Sosyal, Kültürel ve Bilimsel Faaliyetlerinin Gerçekleştirileceği Çok Amaçlı Sosyal Alan	4.440 m ²	5.089 m ² (Lojman ve Çok Amaçlı Sosyal Alan)
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İdari Hizmet Binası 1. Etap Projesi	55.486,96 m ²	38.328 m ²
TOPLAM	59.926,96 m²	46.612,07 m²

A.4. Öğrenci Sayıları

Tablo 3: Öğrenci Sayıları

Enstitülerdeki Öğrencilerin Yüksek Lisans (Tezli/ Tezsiz) ve Doktora Programlarına Dağılımı					
Birimin Adı	Programı	Yüksek Lisans Yapan Sayısı		Doktora Yapan Sayısı	Toplam
		Tezli	Tezsiz		
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü	Savunma Teknolojileri ABD	79	-	16	95
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü	Tarım Bilimleri ABD	18	-	6	24
TOPLAM		97		22	119


A.5. Personel Sayıları

A.5.1. Akademik Personel

Tablo 4: Akademik Personel

Akademik Personel		
	2020	2021
Profesör	4	5
Doçent	5	4
Dr. Öğr. Üyesi	19	26
Öğretim Görevlisi	5	6
Okutman	-	-
Araştırma Görevlisi	33	35
Uzman	-	-
Çevirici	-	-
TOPLAM	66	76

Grafik 1: Akademik Personel




A.5.2. İdari Personel

Tablo 5: İdari Personel

İdari Personel (Kadrolu-Sözleşmeli Pozisyonu- Sürekli İşçi Pozisyonu)		
	2020	2021
Genel İdari Hizmetler	24	36
Sağlık Hizmetleri	0	0
Teknik Hizmetler	10	14
Eğitim ve Öğretim Hizmetleri	0	0
Avukatlık Hizmetleri	0	0
Din Hizmetleri	0	0
Yardımcı Hizmetler	2	2
Sözleşmeli	0	0
Sürekli İşçi	25	25
TOPLAM	61	77


Grafik 2: İdari Personel

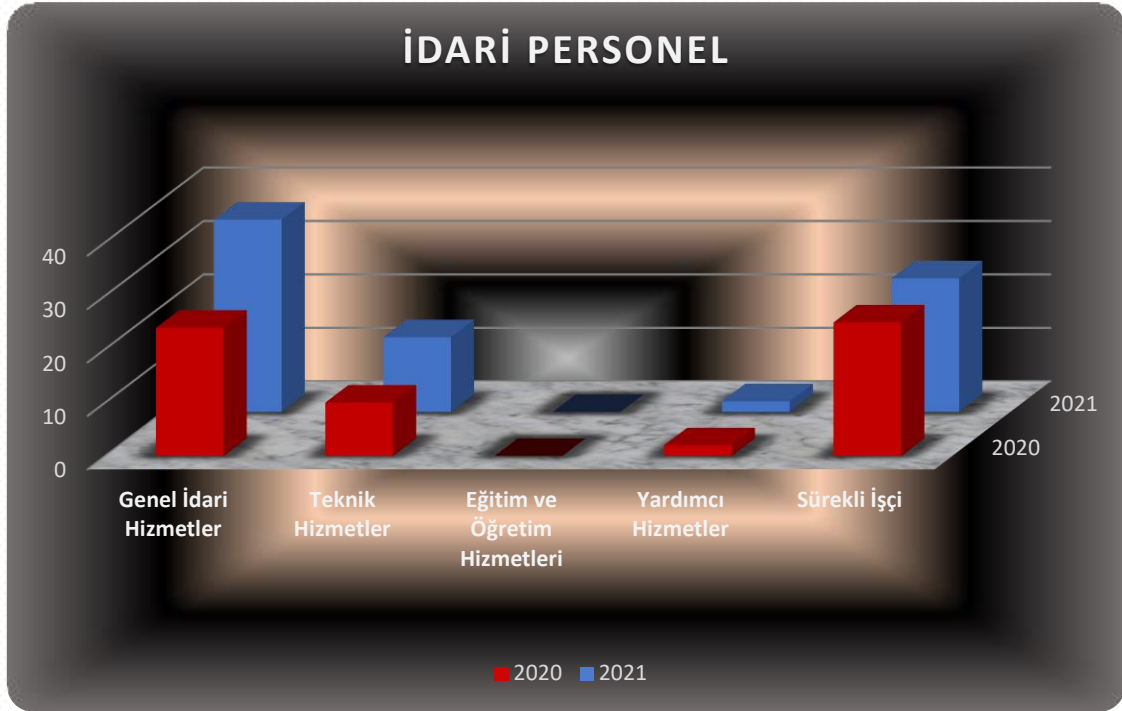

A.6. Örgüt Yapısı

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin akademik ve idari organizasyon şeması aşağıda sunulmuştur.

SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ORGANİZASYON ŞEMASI

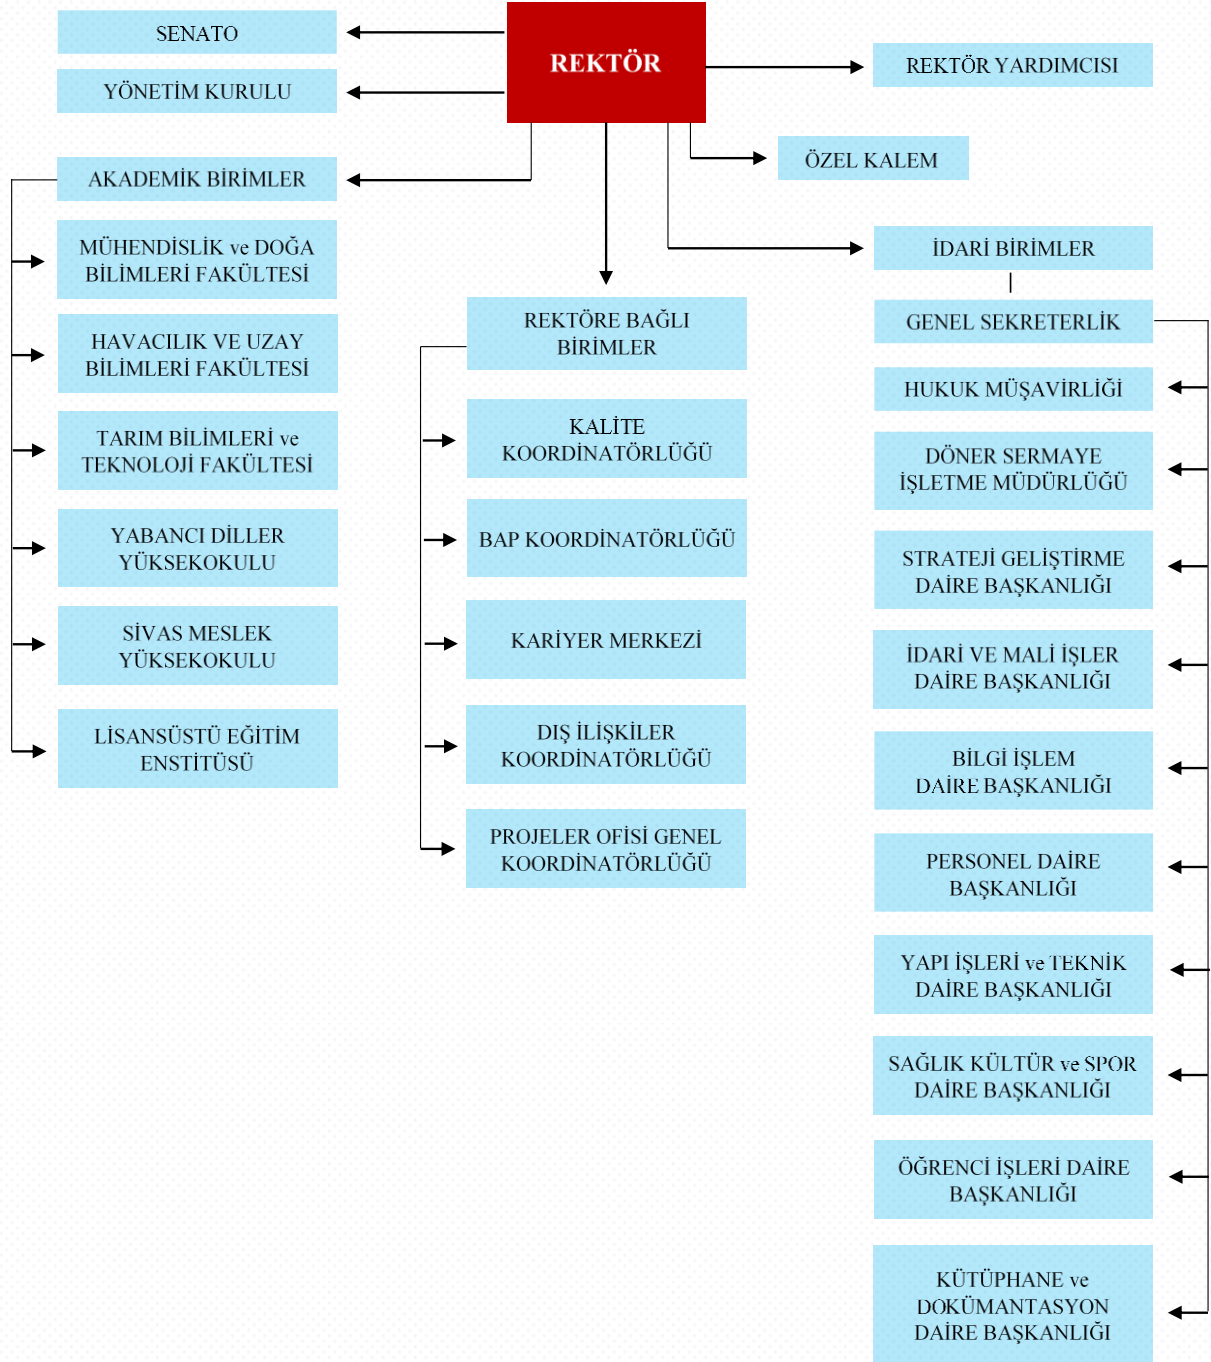

B. KURULUŞUN FİNANSMAN KAYNAKLARI

B.1. Bütçe Gelirleri

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun (II) Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin (A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup Özel Bütçeli bir kurumdur.

Gelirlerimiz; Hazine Yardımı, Öz Gelirler, Bağış ve Yardımlar, Bütçe Dışı Kaynaklardan oluşmaktadır.

Tablo 6: Bütçe Gelirleri

GELİR AÇIKLAMASI	PLANLAN GELİR (TL)	GERÇEKLEŞEN GELİR (TL)
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0,00	14.935,98
04-2 Hazine Yardımları	43.325.000	51.084.000
04.4- Şartlı Bağış ve Yardımlar	0,00	512.454,94
05-Diğer Gelirler	378.000,00	367.627,35
TOPLAM	43.703.000,00	51.979.018,39

Grafik 3: 2021 Yılı Bütçe Gelir Durumu




B.2. Kuruluşun Yatırım Programı Proje Finansman Kaynakları

2021 mali yılında üniversitemiz yatırımları için başlangıç ödeneği 28.500.00 TL ödenek olup yılsonu ödeneği 39.865.830 TL olarak gerçekleşmiştir. Üniversitemizin 2021 Yılı Yatırım Programında yer alan projelere toplamda likit karşılığı olarak 6.164.330 TL ödenek eklenmiştir. 5.000.000 TL'si yatırımları hızlandırma ödeneğinden, Şartlı Bağış ve Yardım olarak ise 201.500 TL olmak üzere toplamda 11.360.830 TL ödenek eklenmiştir.

Yatırım finansman kaynaklarımızın %84'lük kısmını yılı hazine yardımları oluştururken %15'lik kısmını net finansman kaynaklarımız ve % 1'lik kısmını şartlı bağış ve yardım kaynakları oluşturmaktadır. Yatırım programı kapsamında proje ödeneklerinde mevcut ödenekleri kullanılarak ödenek üstü harcama gerçekleşmemiştir.

Grafik 4: 2021 Yılı Yatırım Programı Proje Finansman Kaynak Dağılım Oranı

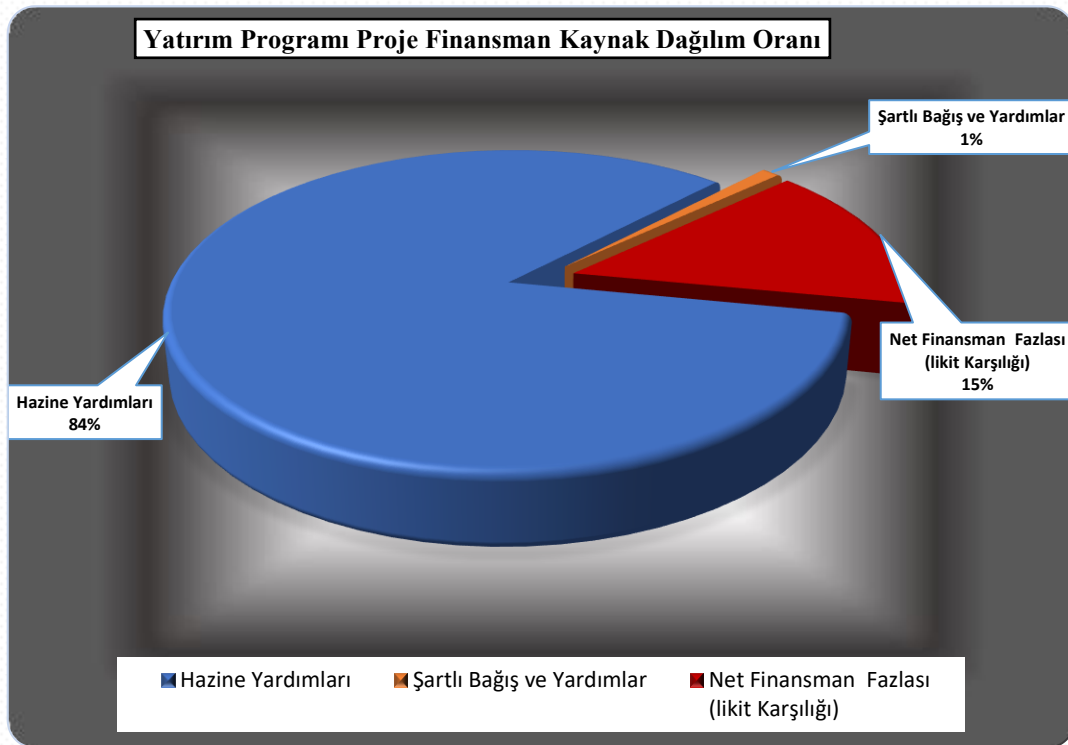

Tablo 7: Yatırım Programı Proje Finansman Kaynakları

Proje No	Proje Adı	2021 Yılı Program Ödeneği (TL)	Net Finansman Fazlası (TL)	Şarth Bağış ve Yardım	Kurum İçi Aktarma	Yatırım Hızlandırma Ödeneğinden Aktarma	2021 Yıl Sonu Revize Ödeneği(TL)
2021H03-168056	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	500.000	-	-	-405.600		94.400
2020H03-151902	Kampüs Altyapısı	3.000.000	-	-	105.600		3.105.600
2020H03-151910	Derslik ve Merkezi Birimler (Merkez Derslik 1. Etap Projesi)	20.000.000	4.857.330	-			24.857.330
2021H03-168057	Muhtelif İşler	3.900.000	1.307.000	201.500	772.000	5.000.000	11.007.910
					-172.590		
2021H03-168061	Yayın Alımı	750.000	-	-	-512.000		238.000
2021H03-168061	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi	350.000	-	-	212.590		562.590
TOPLAM		28.500.000	6.164.330	201.500	0	5.000.000	39.865.830


B.3. Bütçe Giderleri

Üniversitemiz 2020 ve 2021 yıllarına ait ekonomik bazda ödenekler ve harcamaları aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.

Tablo 8: Personel Giderleri

01-Personel Giderleri					
Yılı	KBÖ (TL)	Eklenen (TL)	Düşülen (TL)	Yıl Sonu Net Ödenek (TL)	Harcama (TL)
2020	3.883.000	4.417.680	445.400	7.855.280	7.809.594
2021	8.272.000	8.580.040	2.463.340	14.378.300	14.346.752


Grafik 5: Personel Giderleri



Tablo 9: Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Prim Giderleri

02-Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Prim Giderleri					
Yılı	KBÖ (TL)	Eklenen (TL)	Düşülen (TL)	Yıl Sonu Net Ödenek (TL)	Harcama (TL)
2020	221.000	905.460	14.000	1.112.460	1.110.290
2021	1.185.000	964.950	233.850	1.916.100	1.900.131


Grafik 6: Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Primi Giderleri

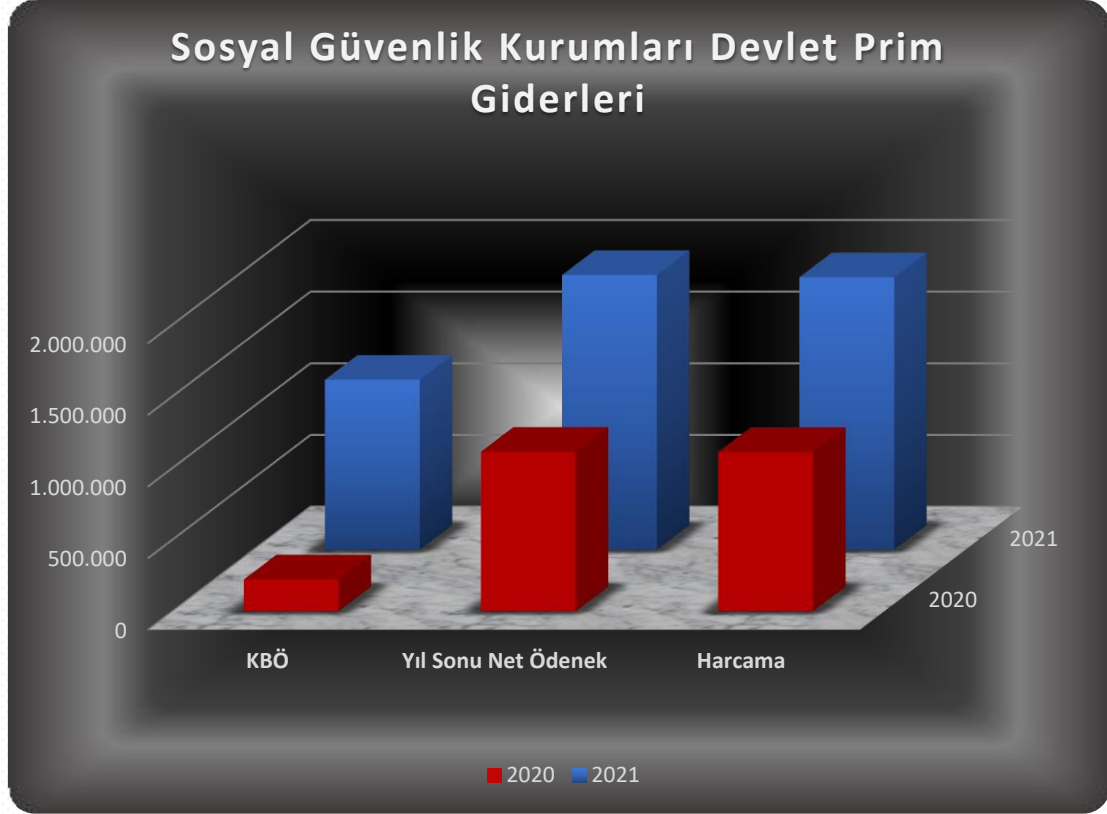

Tablo 10: Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri					
Yılı	KBÖ (TL)	Eklenen (TL)	Düşülen (TL)	Yıl Sonu Net Ödenek (TL)	Harcama (TL)
2020	5.000.000	83.000	826.000	4.257.000	3.633.666
2021	5.497.000	2.184.037	662.682	7.018.355	6.602.389


Grafik 7: Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

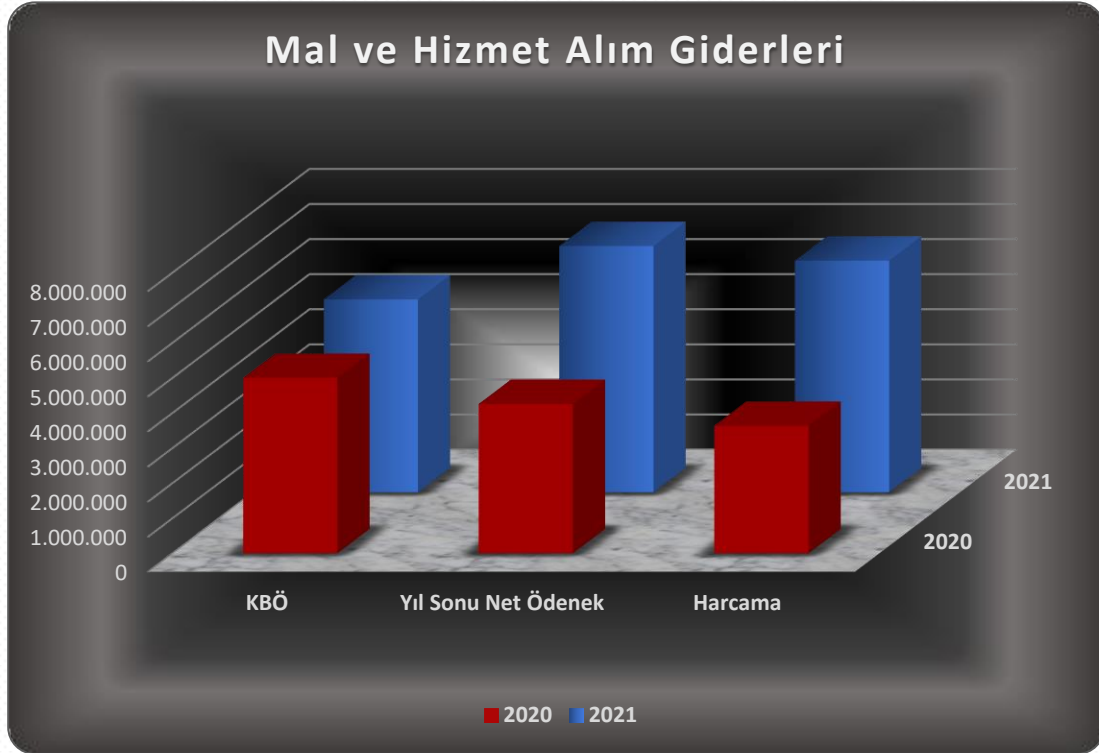

Tablo 11: Cari Transferler

05-Cari Transferler					
Yılı	KBÖ (TL)	Eklenen (TL)	Düşülen (TL)	Yıl Sonu Net Ödenek (TL)	Harcama (TL)
2020	243.000	-	-	243.000	159.296
2021	249.000	50.000	0	299.000	277.498


Grafik 8: Cari Transferler



Tablo 12: Sermaye Giderleri

06-Sermaye Giderleri					
Yılı	KBÖ (TL)	Eklenen (TL)	Düşülen (TL)	Yıl Sonu Net Ödenek (TL)	Harcama (TL)
2020	11.000.000	6.294.953	895.000	16.399.953	10.238.328
2021	28.500.000	12.456.020	1.090.190	39.865.830	25.220.645

Grafik 9: Sermaye Giderleri

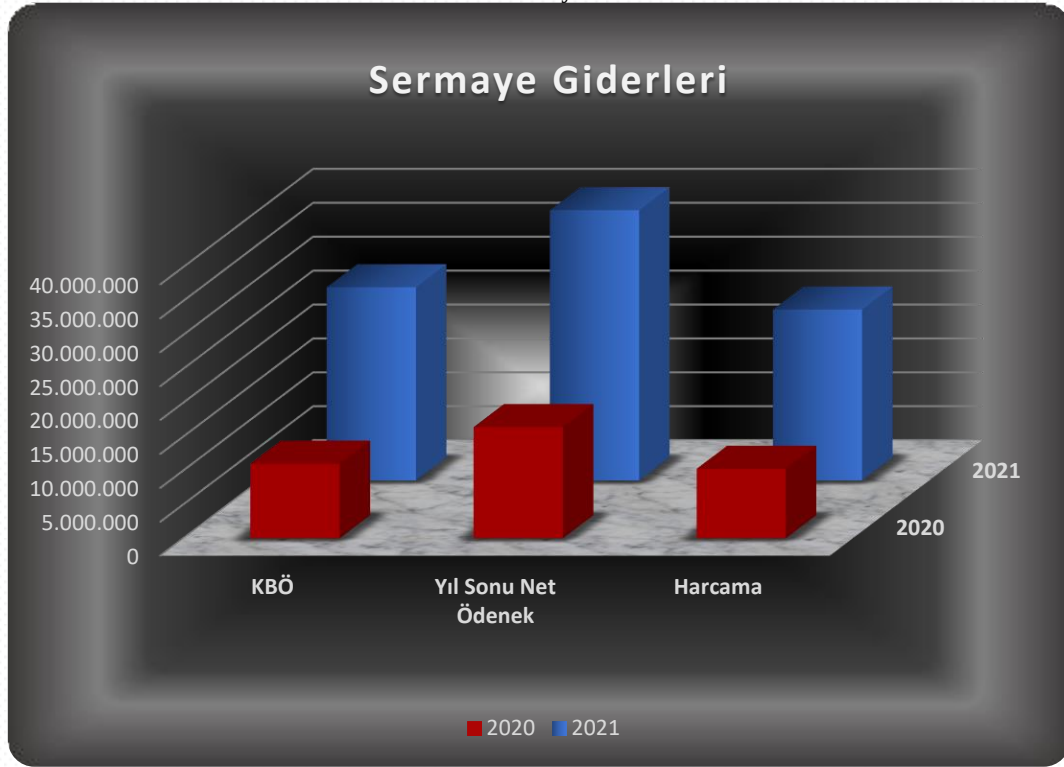

C. 2021 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI

Üniversitemizin 2021 yılı yatırım programında toplam altı adet projesi bulunmaktadır. Yatırım programında yer alan projelerinin tamamı eğitim sektöründe yer almaktadır. Mevcut projelerimiz, Muhtelif İşler, Yayın Alımı, Bilgi Yönetim Sistemleri, Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi, Derslikler ve Merkezi Birimler Merkez Derslik 1. Etap Projesi, Kampüs Altyapısı, olup, yılı içerisinde proje işlemleri gerçekleşmiştir.

Bu projelerle Üniversitemize ihtiyaç duyulan yeni hizmet binasının yapılması, makine ve teçhizat, büro mobilya, bilgi teknolojileri, basılı yayın ve elektronik veri tabanı ihtiyaçlarının karşılanması, bina ve makine-teçhizatların bakım onarımları ile altyapı ve tesislerin yapım işlerinin yapılması ve birimlerin ihtiyaç duyduğu etüt projelerin hazırlanması hedeflenmiştir. 2021 yılı bütçesinde yatırımlarımız için tahsis edilen ödeneklerden yapılan harcamaların tamamı amacına ve mevzuatına uygun olarak kullanılmıştır.

Herhangi bir üniversiteden ekleme/ bölünme olmaksızın kurulan Üniversitemizin kuruluş çalışmaları halen devam etmektedir. Strateji Bütçe Başkanlığınca desteklenen yatırım projeleri kapsamında;

Üniversitemiz 2020-2022 Yılı Yatırım Programı "eğitim sektörü" altında yer alan 2020H03-151910 numaralı "Derslik ve Merkezi Birimler Merkez Derslik 1. Etap Projesi" için 33.000.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödenek kapsamında projenin 2020 yılında ihalesi yapılmış ve ihale sonucu ilgili yüklenici firma ile sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında iş artışı vb. sonucu iş bitiş tarihi Mayıs 2022'dir.

2020 Bahar dönemi itibari ile Lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetine başlayan Üniversitemizin hizmet binası ve alt yapısının tamamlanmasına müteakiben 2022 Güz döneminde lisans/ön lisans düzeyinde de eğitim-öğretime başlaması planlanmıştır.

Bu çerçevede söz konusu projenin 2021 yılında tamamlanmasına yönelik gerekli finansal vb. adımlar atılmıştır.

Ancak Covit-19 salgını vb. gerçekleştirmelerin ekonomik yansımaları ile tedarik sürecinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle fiziki gerçekleştirme %82 oranına ulaşmış olup proje kapsamında 32.500.000 TL tahsis edilen ödeneğin 7.642.670,00 TL'si 2020 yılında, 15.268.884,00 TL si 2021 yılında olmak üzere toplam 22.911.554 TL' si harcanmıştır.

Projenin kalan 9.588.446 TL'lik kısmından 2022 yılı Nisan -Mayıs ayı hakediş ödemelerinde kullanılmak üzere planlanmıştır.

Üniversitemiz Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kampüs Çevre Düzenleme İşİ Geçici Kabulü yapılmış ve İdari Hizmet Binası Peyzaj Projesi hizmet alımı yapılmıştır.

Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi kapsamında Lojman ve Çok amaçlı Sosyal Tesisin Tadilat Projesi tamamlandı, Ayrıca AR-GE Binası Takım Projeleri tamamlanmış olup İdari Hizmet Binası 1. Etap İhdas-Tevhit-İfraz-Rıza-i Taksim işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Üniversitemizin eğitim öğretim, araştırma geliştirme ve diğer faaliyetlerini yürütebilmesi için muhtelif işler projesi kapsamında “makine teçhizat” karakteristik alımlarında öncelikli ve önemli ihtiyaçları için tespit çalışmaları yapılmış ve alımlar gerçekleştirilmiştir. Projenin “Büyük Onarım” karakteristiği kapsamında Lojman ve Çok Amaçlı Sosyal Tesis Tadilatı Geçici Kabulü yapıp, Muhtelif Elektrik Malzemesi Alımı ile Muhtelif İnşaat Malzemesi Alımı gerçekleştirildi. Ayrıca laboratuvarların, kurumumuza geçici tahsisi yapılan rektörlük binası ile tahsis edilen yerlerin bakım onarımı yapılmıştır. Proje “yazılım” karakteristiğinde bulunan mevcut ödeneği ile elektronik sertifika ve mini kart, antivirüs yazılım alımları ile program yazılım alımları gerçekleştirilmiştir.

Bilgi Yönetim Sistemleri projesi ile verilerin toparlanması, arşivlenmesi ve bunların standartlaştırılabilmesi için proje kapsamında İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ile sözleşme imzalanmıştır.

Henüz bir yerleşkesinin olmaması ve Cumhuriyet Üniversitesi Teknokente konuşlandırılan Üniversitemizin kütüphanesi olmayıp, kütüphane kaynakları kısıtlıdır. 2021 Yılında Yayın Alımları proje kapsamında; eğitim öğretim faaliyetlerini destekleyecek ve çekirdek koleksiyon oluşturacak nitelikte yerli ve yabancı basılı kitap sağlamak amaçlanmıştır. Bu amaçla Üniversite bölümlerine ve genel ilgiye yönelik çeşitli alanlardan 1555 kitap alınmıştır. Yerleşkemize taşınmakla birlikte kütüphanemiz, elektronik ve basılı koleksiyonlarımızın çeşitliliğinin artırılması hedeflenmektedir.



D. YATIRIM PROJE UYGULAMALARI

Yatırım projelerimizin KBÖ' sü 28.500.000 TL olup, Derslik ve Merkezi Birimler Projesine yılı içerisinde 4.857.330 TL, Muhtelif İşler Projesinde “makine ve teçhizat” karakteristiğine 1.307.000 TL net finansman fazlasından, 201.500 TL si şartlı bağış ve yardım ödenek kaydı, 5.000.000 TL yatırımları hızlandırma ödeneğinden ödenek aktarımı yapılarak yıl sonu ödeneğimiz 39.865.330 TL' ye ulaşmıştır. Mevcut ödeneğin 25.220.645 TL'lik kısmı harcanmıştır.


Tablo 13: Yatırım Projeleri

Sıra No	Proje No	Proje Adı	Proje Sahibi	Proje Yürütücüsü
1	2021H03-168056	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	SBTÜ	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
2	2020H03-151902	Kampüs Altyapısı	SBTÜ	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
3	2020H03-151910	Derslik ve Merkezi Birimler (Merkez Derslik 1. Etap Projesi)	SBTÜ	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
4-1	2021H03-168057	Muhtelif İşler (Büyük Onarım)	SBTÜ	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
4-2	2021H03-168057	Muhtelif İşler (Yazılım)	SBTÜ	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
4-3	2021H03-168057	Muhtelif İşler (Makine-Teçhizat)	SBTÜ	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
5	2021H03-68.061	Yayın Alımı	SBTÜ	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
6	2021H03-168065	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi	SBTÜ	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Tablo 14: Yatırım Harcamaları (Ekonomik iki düzeyde)

PROJE ADI	EKONOMİK KOD (İKİ DÜZEY)	2021 YILI ÖDENEĞİ (TL)	EKLENEN (TL)	DÜŞÜLEN (TL)	2021 YILI GÜNCEL PROJE TUTARI (TL)	2021 YILI HARCAMASI (TL)
ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ	06.5	500.000	-	405.600	94.400	94.400
KAMPÜS ALTYAPISI	06.5	3.000.000	105.600	-	3.105.600	3.103.976
DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER MERKEZ DERSLİK 1. ETAP PROJESİ	06.5	20.000.000	4.857.330	-	24.857.330	15.268.884
MUHTELİF İŞLER (MAKİNE TEÇHİZAT)	06.1	3.340.000	6.980.500	-	10.320.500	5.291.750
MUHTELİF İŞLER (BİLGİSAYAR YAZILIM)	06.3	200.000	-	158.090	41.910	41.909
MUHTELİF İŞLER (BÜYÜK ONARIM)	06.7	360.000	300.000	14.500	645.500	623.679
YAYIN ALIM	06.1	750.000	-	512.000	238.000	233.778
ÜNİVERSİTE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ	06.3	350.000	212.590	-	562.590	562.267
TOPLAM		28.500.000	12.456.020	1.090.190	39.865.830	25.220.645

Grafik 10: Yatırım Harcama Oranları

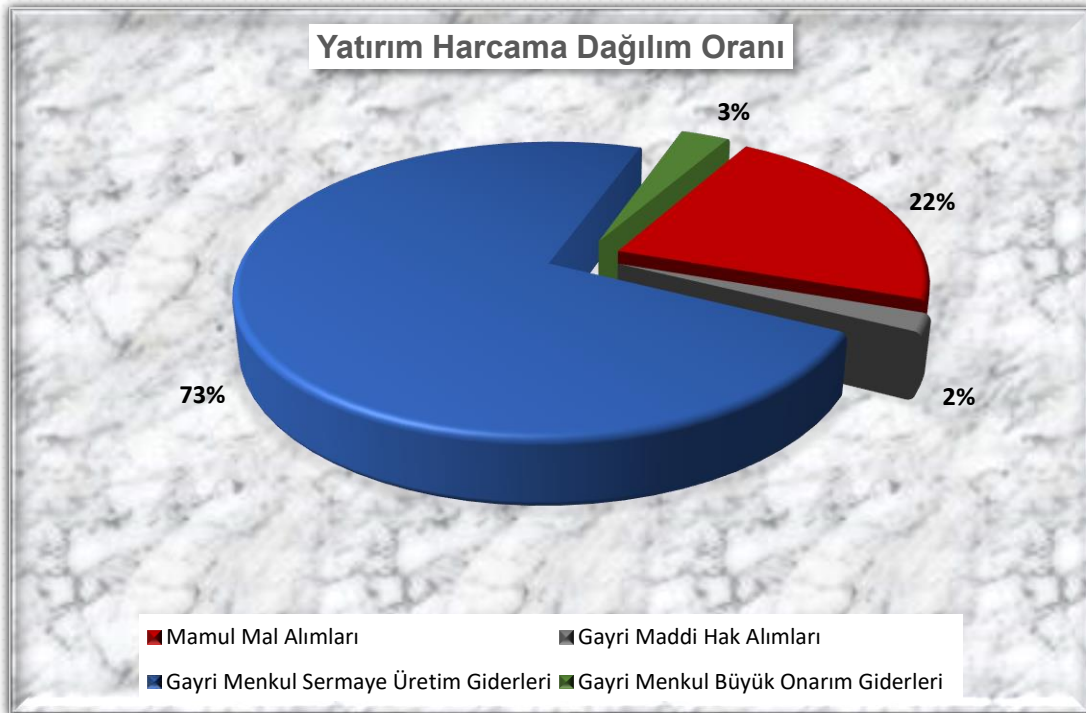

Dört Düzeyde Yatırım Harcamaları

Tablo 15: 06.1 Yatırım Harcamaları (Ekonomik Kod Dört Düzeyde)

Hesap Kodu	Kod Açıklaması	Harcama Birimi	Harcama Tutarı
06.01.10.01	Büro Mefruşatı Alımları	İdari ve Mali İşleri Daire Başkanlığı	116.488,53
06.01.20.01	Büro Makinaları Alımları	İdari ve Mali İşleri Daire Başkanlığı	261.318,58
06.01.20.02	Bilgisayar Alımları	İdari ve Mali İşleri Daire Başkanlığı	440.294,00
06.01.20.04	Laboratuvar Cihazı Alımlar	İdari ve Mali İşleri Daire Başkanlığı	1.483.438,58
06.01.20.90	Diğer Makine Teçhizat Alımları	İdari ve Mali İşleri Daire Başkanlığı	2.982.967,57
06.01.30.02	Atölye Gereçleri Alımlar	İdari ve Mali İşleri Daire Başkanlığı	7.242,77
06.01.60.01	Basılı Yayın Alımları ve Yapımlar	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	233.778,98
TOPLAM			5.525.529,01

Tablo 16: 06.3 Yatırım Harcamaları (Ekonomik Kod Dört Düzeyde)

Hesap Kodu	Kod Açıklaması	Harcama Birimi	Harcama Tutarı
06.03.10.01	Bilgisayar Yazılımı Alımları	İdari ve Mali İşleri Daire Başkanlığı	41.909,00
06.03.10.01	Bilgisayar Yazılımı Alımları	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	562.267,32
TOPLAM			604.176,32

Tablo 17: 06.5 Yatırım Harcamaları (Ekonomik Kod Dört Düzeyde)

Hesap Kodu	Kod Açıklaması	Harcama Birimi	Harcama Tutarı
06.05.10.01	Proje Giderleri	Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı	132.160,00
06.05.70.01	Hizmet Binası Yapım Giderleri	Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı	15.268.883,83
06.05.70.90	Diğer Müteahhitlik Giderleri	Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı	3.066.216,10
TOPLAM			18.467.259,93

Tablo 18: 06.7 Yatırım Harcamaları (Ekonomik Kod Dört Düzeyde)

Hesap Kodu	Kod Açıklaması	Harcama Birimi	Harcama Tutarı
06.07.20.01	İnşaat Malzemesi Giderleri	Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı	27.900,62
06.07.20.02	Elektrik Tesisatı Giderleri	Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı	2.558,41
06.07.70.03	Lojman Büyük Onarım Giderleri	Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı	593.220,39
TOPLAM			623.679,42

D.1. Devam Eden Projeler

Tablo 19: Derslik ve Merkezi Birimler

PROJENİN ADI	DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER
PROJENİN NUMARASI	2020H03-151910
SEKTÖRÜ	EĞİTİM
PROJE BAŞLAMA YILI	2020
PROJE BİTİŞ YILI	2022
KARAKTERİSTİĞİ	Eğitim (16.325 m ²)
ALT KARAKTERSTİĞİ	Üniversitemiz Rektörlük Hizmet Binası- Merkezi Derslikler İnşaatı
PROJE BÜTÇESİ (TL)	33.000.000
2021 YILI BÜTÇESİ (TL)	20.000.000
EKLENEN (TL)	4.857.330
DÜŞÜLEN (TL)	-
2021 YILI TOPLAM ÖDENEĞİ (TL)	24.857.330
HARCANAN (TL)	15.268.884
PROJEYE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME	Projenin bitiminde Üniversitemiz kendine ait bir kampüs alanı ve fiziki yapıya, Savunma Sanayine katkı sağlayacak teknolojik donanımına sahip laboratuvarlar tamamlanmış olacaktır. Sosyal çevre ve ulaşım avantajıyla daha iyi bir konumda bulunacaktır. Ülkemizin ulusal kalkınma ve özellikle ulusal güvenliği ilgilendiren alanlarda dışa bağımlılığa son verip uluslararası rekabette hak ettiği yeri alması için gerçekleştirilen ulusal düzeydeki çalışmaları akademik düzeyde yürütecek olan Üniversitemizin, fiziki mekân ihtiyacını karşılayacaktır. Mimari Proje İmalatları, Statik Proje İmalatları, Mekanik Tesisat, Elektrik Tesisat, Bina karkas halinde teslim alındığı için, projeye uyumlayan ölçü ve yapı elemanları tespit edilmiş olup uygulama aşamasında fen ve sanat kurallarına uygun hale getirilmiştir. Mekanik ve Elektrik Tesisatında; Mekanikte bulunan havalandırma-ısıtma Tesisatı proje üzerinde, Elektrik Tesisatında bulunan kuvvetli-zayıf akım taşıma konsollarıyla aynı yerde bulunmaktadır. Uygulama aşamasında fen ve sanat kurallarına göre uygun yerlere montajı yapılmıştır. İhtiyaç duyulan tüm mal ve hizmetler 4734 sayılı KİK çerçevesinde çözülerek temin edilmiş bu manada herhangi bir sorunla karşılaşmamıştır. Uygulama projesini inceleme süresi kısıtlı olması sebebiyle, bu sorunlarla karşılaşmıştır. Yeni projelerde yeterli zaman sağlandığı takdirde, bu eksiklikler minimize edilecektir.

Derslik ve Merkezi Birimler Merkez Derslik 1. Etap İnşaatı Proje Yapım Aşaması Görselleri



Tablo 20: Kampüs Altyapısı

PROJENİN ADI	KAMPÜS ALTYAPISI
PROJENİN NUMARASI	2020H03-151902
SEKTÖRÜ	EĞİTİM
PROJE BAŞLAMA YILI	2020
PROJE BİTİŞ YILI	2022
KARAKTERİSTİĞİ	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon Hattı, Peyzaj, Su İsale Hattı, Telefon Hattı
ALT KARAKTERİSTİĞİ	Üniversitemiz Rektörlük Hizmet binası inşaat alanı alt yapı çalışmaları
PROJE BÜTÇESİ (TL)	3.000.000
2021 YILI BÜTÇESİ (TL)	3.000.000
EKLENEN (TL)	105.600
DÜŞÜLEN (TL)	-
2021 YILI TOPLAM ÖDENEĞİ (TL)	3.105.600
HARCANAN (TL)	3.103.976
PROJEYE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME	Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin şehirdeki eğitim/öğretim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Üniversite kampüs alanı olarak kullanılacaktır. Üniversite bünyesinde kurulması planlanan fakültelerin tarım, mühendislik, doğa bilimleri vb. bu fakültelerin Sivas kentinin sembol yapılarına ve özgün kent silüetine hâkim bir noktada kurulacak olması ve bu durumun ise öğrencilerin kentte ve üniversiteye olan aidiyet duygusunu geliştireceği, kent makro formunda; eğitim, kültür, sanat, sosyal aktiviteler yönünden bölgenin cazibe merkezi olarak ulaşılabilirliğini yükseltecek ve kent gelişimine olumlu yönde katkı sağlayacaktır. Üniversite Yer Seçim Kurulunun 18.04.2019 – 1 tarih ve sayılı kararı ile Sivas İli, Merkez İlçesi Kadı Burhanettin Mahallesi 371 ada 134 parselin Üniversite kurulması amacına uygun olduğuna ve Maliye Hazinesi adına kayıtlı bu taşınmazın Üniversiteye tahsis edilmesinin uygun olduğuna karar verilmiştir. İlgili ihtiyaç tespitleri, fizibilite çalışmaları kapsamında proje çalışmaları yapılmaktadır. Üniversite kampüs alanının içinde yapılacak peyzaj düzenlemesinin ve çevre duvarlarının dışında kalan alandaki yollar, kaldırım ve peyzaj düzenlemelerinin yapılması ile Üniversite kampüs alanının çevre yollarının düzenlenmesi ile su, kanalizasyon, elektrik, telefon ve internet altyapılarının yapılması planlanmıştır. Kampüs alan peyzajında kullanılacak aydınlatmaların yapılması ve çevre yollarının aydınlatmalarının yapılması için Kamu Kurum ve Kuruluşlarının koordinasyonuna ihtiyaç duyulmaktadır.

D.2. Tamamlanan Projeler

Tablo 21: Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi


Projenin Yatırım Programı Parametreleri (TL)						
				Yatırım Programına Alınış Değerleri	Revize Edilmiş Son Değerler	
Proje No	2021H03-168056			500.000	94.400	
Proje Adı	ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ					
Sektör/Altsektör	Eğitim					
Proje Amacı	Üniversitenin Sosyal, Kültürel ve Bilimsel Faaliyetlerinin Gerçekleştirileceği Çok Amaçlı Sosyal Alan					
Proje Yeri	Merkez / Sivas					
Karakteristiği	Betonarme Yapı					
Başlama ve Bitiş Tarihi	2021-2021					
Proje Sözleşme Tarihi			Sözleşme İhale Bedeli			
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
					-	
Yıllar İtibariyle Yapılan Harcama						
Cari Fiyatlarla				2021 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl					94.400	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Projenin bitiminde Üniversitemize ait, Lojman ve Üniversitenin sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyetlerini gerçekleştirileceği çok amaçlı sosyal alana sahip olacaktır. Üniversitemiz Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi AR-GE çalışmalarını yürütebileceği alana sahip olacaktır.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	Uluslararası alanda tanınırlığı olan etkinliklerin bölgede gerçekleştirilmesi sağlanacaktır					
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Merkez İlçe, İşhan Köyünde bulunan mülkiyeti Hazineye ait 4440 m ² yüzölçümlü 5089 m ² kapalı alana sahip 5129 ada 1 parsel numaralı taşınmazın 02.02.2020 tarihinde Üniversitemize kesin tahsisi yapılmıştır					
	Üniversitemize tahsis edilen söz konusu taşınmaz, arşiv ve depo olarak kullanılmaktadır. Ancak, Üniversitemiz ihtiyaçları çerçevesinde çok amaçlı sosyal alan olarak kullanılabilmesi için, büyük çaplı bakım-onarım ihtiyacı vardır. Bu aşamada gerekli tüm plan-projeleri hazırlanmıştır.					
	Üniversitemiz Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi AR-GE çalışmalarının yürütülebileceği alanın projeleri hazırlanmıştır.					
	İdari Hizmet Binası 1. Etap İhdas-Tevhit-İfraz-Rıza-i Taksim işlemleri tamamlanmıştır					

Tablo 22: Muhtelif İşler (Büyük Onarım)

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (TL)						
				Yatırım Programına Alınış Değerleri		Revize Edilmiş Son Değerler
Proje No	2021H03-168057			360.000		645.500
Proje Adı	MUHTELİF İŞLER					
Sektör/Altsektör	Eğitim					
Proje Amacı	Bina Bakım Onarım					
Proje Yeri	Merkez/Sivas					
Karakteristiği	Büyük Onarım					
Başlama ve Bitiş Tarihi	2021-2021					
Proje Sözleşme Tarihi			Sözleşme İhale Bedeli			
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
Yıllar İtibariyle Yapılan Harcama						
Cari Fiyatlarla				2021 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl					623.679	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Projenin bitiminde Üniversitemize ait, Lojman ve Üniversitenin sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyetlerini gerçekleştireceği çok amaçlı sosyal alana sahip olacaktır.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	Uluslararası alanda tanınırlığı olan etkinliklerin bölgede gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.					
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Üniversitemize tahsis edilen Lojman ve Üniversitenin sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyetlerini gerçekleştireceği çok amaçlı sosyal alan, arşiv ve depo olarak kullanılmaktadır. Ancak, Üniversitemiz ihtiyaçları çerçevesinde çok amaçlı sosyal alan olarak kullanılabilmesi için, büyük çaplı bakım-onarım ihtiyacı vardır. Bu aşamada gerekli tüm plan-projeleri hazırlanmıştır. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Lojman ve Çok Amaçlı Sosyal Tesis Tadilatı Yapım işi ihale edilmiş ve geçici kabulü yapılmıştır.					

Tablo 23: Muhtelif İşler (Makine- Teçhizat)

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (TL)						
				Yatırım Programına Alınış Değerleri	Revize Edilmiş Son Değerler	
Proje No	2021H03-168057			3.340.000	10.320.500	
Proje Adı	MUHTELİF İŞLER					
Sektör/Altsektör	Eğitim					
Proje Amacı	Makine-Teçhizat					
Proje Yeri	Merkez/Sivas					
Karakteristiği	Makine -Teçhizat					
Başlama ve Bitiş Tarihi	2021-2021					
Proje Sözleşme Tarihi			Sözleşme İhale Bedeli			
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
Yıllar İtibariyle Yapılan Harcama						
Cari Fiyatlarla				2021 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl					5.291.750	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Yeni kurulan bir üniversite olduğumuz için, akademik ve idari personelin büro işyeri makine teçhizat ve tefrişat ihtiyaçlarının karşılanması sonucu akademik-idari çalışmalara hızlı bir şekilde başlanılmıştır. Yüksek lisans ve doktora programları ile eğitim ve öğretime başlayan Üniversitemizde gerekli olan derslik ve laboratuvar altyapısının kurulması planlanmış ve sonucunda kaliteli eğitim ve öğretim hizmeti hedef olarak seçilmiştir.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	Üniversite eğitim/öğretim ve araştırma/geliştirme ile diğer yürüttüğü hizmet faaliyetlerinin daha etkin ve kaliteli hale getirilmesi hedeflenmektedir.					
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Yeni kurulan bir Üniversite olarak özellikle satın alma ve ihale konularında nitelikli personel alma sıkıntısı, ihale sürecinde ilan süreleri, alınacak cihaz-malzemelerin teknik şartnamelerinin istenilen nitelikte hazırlanamaması, ihalelere yönelik şikâyetler, ihale komisyonlarında görev alacak personelin bu süreçler ile ilgili bilgi düzeyi satın alma süreçlerine olumsuz etki yapmaktadır.					

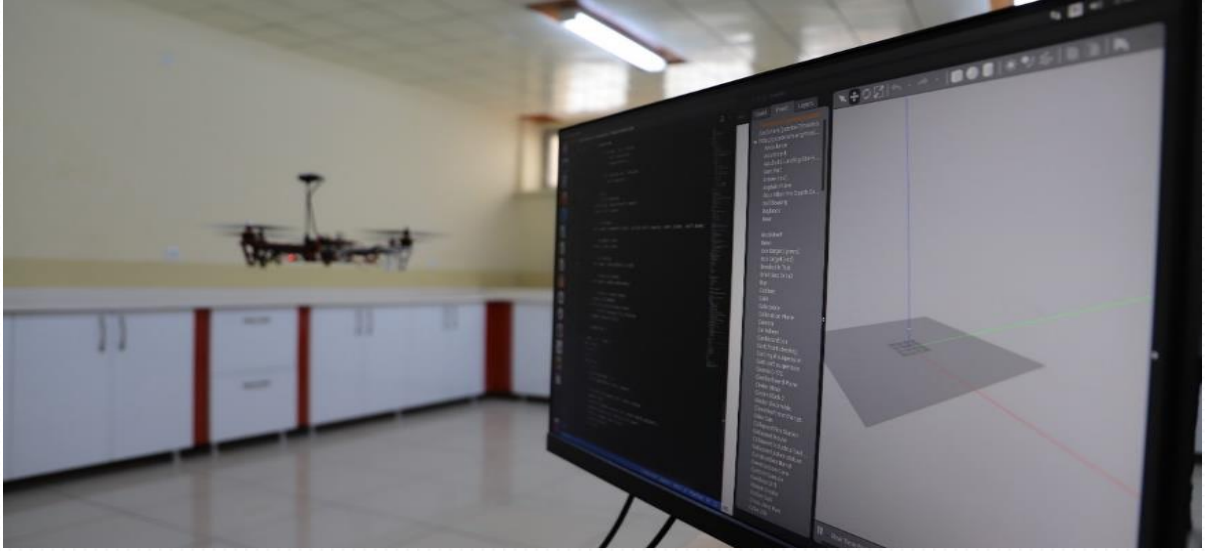

Tablo 24: Muhtelif İşler (Yazılım)

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (TL)						
				Yatırım Programına Alınış Değerleri	Revize Edilmiş Son Değerler	
Proje No	2021H03-168057			200.000	41.910	
Proje Adı	MUHTELİF İŞLER					
Sektör/Altsektör	Eğitim					
Proje Amacı	Yazılım					
Proje Yeri	Merkez/Sivas					
Karakteristiği	Bilgisayar Yazılım					
Başlama ve Bitiş Tarihi	2021-2021					
Proje Sözleşme Tarihi			Sözleşme İhale Bedeli			
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
Yıllar İtibariyle Yapılan Harcama						
Cari Fiyatlarla				2021 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl					41.909	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Gerçekleşen yazılım alımları ile tüm faaliyet alanlarında aksama yaşanmadan daha sağlıklı bir şekilde hizmet edilmesi.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	Üniversite eğitim/öğretim ve araştırma/geliştirme ile diğer yürüttüğü hizmet faaliyetlerinin daha etkin ve kaliteli hale getirilmesi hedeflenmektedir.					
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Yılı içerisinde üniversitemizin 3 yıllık nitelikli elektronik sertifika ve mini kart okuyucu alımı, internet ve mevzuat destekli personel ve insan kaynakları programı alımı ödemesi, antivirüs yazılımı alımları vb. gibi alımlar gerçekleştirilmiştir.					

Tablo 25: Bilgi Yönetim Sistemi

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (TL)						
				Yatırım Programına Alınış Değerleri	Revize Edilmiş Son Değerler	
Proje No	2021H03-168065			320.000	562.590	
Proje Adı	BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ					
Sektör/Altsektör	Eğitim					
Proje Amacı	Yazılım Donanım Kurulumu					
Proje Yeri	Merkez /Sivas					
Karakteristiği	BİT, Danışmanlık, Makine -Teçhizat, Müşavirlik/Kontrollük					
Başlama ve Bitiş Tarihi	2021-2021					
Proje Sözleşme Tarihi			Sözleşme İhale Bedeli			
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
Yıllar İtibariyle Yapılan Harcama						
Cari Fiyatlarla				2021 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl					562.567	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	UBYS alımı gerçekleştirilerek hizmette verimliliği ve etkinliği artırmak.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	Üniversite eğitim/öğretim ve araştırma/geliştirme ile diğer yürüttüğü hizmet faaliyetlerinin daha etkin ve kaliteli hale getirilmesi hedeflenmektedir.					
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	4734 sayılı Kamu İhale Kanunun ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu çerçevesinde; Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ve İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi arasında Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi Teknik Destek alımı adı altında imzalanan sözleşmeye istinaden 2021 yılı ÜBYS yazılım ve teknik destek alımı yapılmıştır.					

The screenshot displays the ÜBYS (University Information Management System) web interface. The interface is in Turkish and features a sidebar on the left with various system modules. The main content area includes sections for 'Yapılacaklar' (To Do) and 'Duyurular' (Announcements). The footer contains social media links and contact information.

Sidebar Modules:

- Sistem Yönetimi
- DİLEK ÖNERİ ŞİKAYET
- STRATEJİK YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ
- Organizasyon Yönetimi
- MOBİL YÖNETİM SİSTEMİ
- İÇ KONTROL SİSTEMİ
- AYRILIŞ SÜREÇ TAKİBİ SİSTEMİ
- UZAKTAN EĞİTİM
- KURUMSAL DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
- KİŞİSEL MEMUR İŞLEMLERİ
- ÖĞRETİM ELEMANI SİSTEMİ
- ÖĞRENCİ SİSTEMİ
- ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ
- FİRMA KAYIT İŞLEMLERİ
- YABANCI DİLLER
- Uluslararası Öğrenci Başvuru Takip Ekranı
- UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ
- EK DERS MODÜLÜ
- ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ
- AKADEMİK PERFORMANS BİLGİ SİSTEMİ
- BAP İŞLEMLERİ
- BAP İŞLEMLERİ

Main Content Area:

- Yapılacaklar** (To Do): 2100001890 numaralı, Görevlendirme (Hizmetçi Eğitim) konulu belge dolaşımı tamamlanmıştır. Bu.
- Duyurular** (Announcements): Duyuru Yok.
- ÜBYS Destek** (ÜBYS Support)
- Kurumsal Değerlendirme Analizi** (Institutional Evaluation Analysis)
- Kurumsal E-Posta** (Institutional E-Mail)

Footer:

- Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
- 1313
- 22.03.2021



Tablo 26: Yayın Alımları

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (TL)						
				Yatırım Programına Alınış Değerleri	Revize Edilmiş Son Değerler	
Proje No	2021H03-168061			750.000	238.000	
Proje Adı	YAYIN ALIM					
Sektör/Altsektör	Eğitim					
Proje Amacı	Yayın Alımı					
Proje Yeri	Merkez /Sivas					
Karakteristiği	Basılı- Elektronik Yayın Alımı					
Başlama ve Bitiş Tarihi	2021-2021					
Proje Sözleşme Tarihi			Sözleşme İhale Bedeli			
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
Yıllar İtibariyle Yapılan Harcama						
Cari Fiyatlarla				2021 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl					233.778	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projenin Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Üniversite eğitim öğretim faaliyetlerini destekleyecek ve çekirdek koleksiyon oluşturacak nitelikte yerli ve yabancı basılı kitap sağlamak amaçlanmıştır. Üniversite bölümlerine ve genel ilgiye yönelik çeşitli alanlardan 1555 kitap alınmıştır.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	Üniversite eğitim/öğretim ve araştırma/geliştirme ile diğer yürüttüğü hizmet faaliyetlerinin daha etkin ve kaliteli hale getirilmesi hedeflenmektedir.					
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	İhale süreçlerinin uzun sürmesi nedeniyle zaman kaybı yaşanmıştır. Üniversite yerleşkesinin henüz faal hale gelmemesi nedeniyle alınan kitapların depolanması zorlaşmıştır. Yabancı kitap fiyatlarındaki pahalılık nedeniyle bazı kitaplar temin edilememiştir. Yüklenici firmalar, ihalede uhdesinde kalan kitapların bazılarını, baskısının olmaması nedeniyle sağlayamamış ve iş eksiltmesi yapılması gerekmiştir. Bazı kitaplar, istekliler tarafından teklif yapılmaması, yaklaşık maliyetin çok üzerinde teklif yapılması gibi nedenlerle ihalede temin edilememiş; bunların bir kısmı daha sonra doğrudan teminle alınmıştır.					



E. YATIRIM PROJE UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÖNERİLER

Nitelikli ve alanında deneyimli personel eksikliğinin giderilmesi ile iş ve işlemlerin daha sağlıklı bir şekilde yürüyeceği düşünülmektedir.

Yatırım ödeneklerinin Ayrıntılı Finansman Programında vize aşamasında idare koşullarının ve gereklerinin dikkate alınması büyük önem arz etmektedir.

Yeni kurulan Üniversitelerin yatırım bütçe tekliflerindeki reel taleplerinin mümkün olduğunca karşılanması, bu üniversitelerin fiziksel kapasitelerini daha hızlı geliştirmelerini sağlayacaktır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre yapılan ihalelerde ihale süreçlerinin uzunluğu, yapılan yatırımların istenilen zamanda bitirilmemesine ve planlanan yatırımlarda sapmalara neden olmaktadır. İhale mevzuatında buna yönelik bazı değişiklikler yapılmasının sorunun çözümünde etkili olacağı düşünülmektedir.

SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2021 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ

BÜTÇE TÜRÜ: İCMAL

2021 YILI FİYATLARIYLA TL

SEKTÖR	PROJE SAYISI	PROJE TUTARI		2020 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA			2021 YILI PROGRAM ÖDENEK			2021 YILI REVİZE ÖDENEK			2021 YILI BAŞINDAN DÖNEM SONUNA KADAR NAKDİ GERÇEKLEŞME		
				DIŞ		TOPLAM	DIŞ		TOPLAM	DIŞ		TOPLAM	DIŞ		TOPLAM
		DIŞ	TOPLAM	KREDİ	ÖZKAYNAK		KREDİ	ÖZKAYNAK		KREDİ	ÖZKAYNAK		KREDİ	ÖZKAYNAK	
TARIM															
MADENCİLİK															
İMALAT															
ENERJİ															
ULAŞTIRMA-HAB.															
TURİZM															
KONUT															
EĞİTİM	6		43.500.000			8.900.000			28.500.000			39.865.830			25.220.645
SAĞLIK															
D.KAMU HİZM.															
İKTİSADİ															
SOSYAL															0
TOPLAM	6	0	43.500.000	0	0	8.900.000	0	0	28.500.000	0	0	39.865.830	0	0	25.220.645

SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
2021 YILI YATIRIM RAPORU

Sıra No*	Proje Adı	Proje No (Yatırım Programında Yer Alan)	BAŞLAMA YILI	BİTİŞ YILI	PROJE TOPLAM ÖDENEĞİ	PROJE 2020 YILI HARCAMASI	2021 YILI ÖDENEĞİ	2021 YILI GÜNCEL PROJE TUTARI	2021 YILI TOPLAM HARCAMA
1	ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ	2021H03-168056	2021	2021	500.000,00	0,00	500.000,00	94.400,00	94.400,00
2	KAMPÜS ALTYAPISI	2020H03-151902	2020	2022	5.000.000,00	200.000,00	3.000.000,00	3.105.600,00	3.103.976,10
3	DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER MERKEZ DERSLİK 1. ETAP PROJESİ	2020H03-151910	2020	2022	33.000.000,00	8.700.000,00	20.000.000,00	24.857.330,00	15.268.883,83
4	MUHTELİF İŞLER	2021H03-168057	2021	2021	3.900.000,00	0	3.900.000,00	11.007.910,00	5.957.338,45
4-1	Makine Teçhizat**				3.340.000,00	0	3.340.000,00	10.320.500,00	5.291.750,03
4-2	Bilgisayar Yazılım				200.000,00	0	200.000,00	41.910,00	41.909,00
4-3	Büyük Onarım				360.000,00	0	360.000,00	645.500,00	623.679,42
5	YAYIN ALIM	2021H03-168061	2021	2021	750.000,00	0	750.000,00	238.000,00	233.778,93
6	ÜNİVERSİTE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ	2021H03-168065	2021	2021	350.000,00	0	350.000,00	562.590,00	562.267,32
	TOPLAM				43.500.000,00	8.900.000,00	28.500.000,00	39.865.830,00	25.220.644,63
	**201.500 TL lik tutar şartlı bağış ve yardımlar kaydı olup, 197.955,83 TL si harcanmıştır.								



**SİVAS
BİLİM VE TEKNOLOJİ
ÜNİVERSİTESİ**



/sivasbtu



/sivas.btu
