



SİVAS
BİLİM VE TEKNOLOJİ
ÜNİVERSİTESİ

2020 YILI KAMU YATIRIMLARI

İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU



/sivasbtu



/sivas.btu


A. GENEL BİLGİLER	6
A.1. Misyon, Vizyon ve Temel Değerler	6
A.2. Kuruluş Tarihçesi	7
A.3. Taşınmaz Alanlar	10
A.4. Öğrenci Sayıları	10
A.5. Personel Sayıları	11
A.6. Örgüt Yapısı	13
B. KURULUŞUN FİNANSMAN KAYNAKLARI	14
B.1. Bütçe Gelirleri	14
B.2. Kuruluşun Yatırım Programı Proje Finansman Kaynakları	15
B.3. Bütçe Giderleri	16
C. 2020 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI	21
D. YATIRIM PROJE UYGULAMALARI	23
D.1. Devam Eden Projeler	25
D.2. Tamamlanan Projeler	28
E. YATIRIM PROJE UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÖNERİLER	36

TABLOLAR

Tablo 1: Akademik Birimlerin Kuruluş Kronolojisi	7
Tablo 2: Taşınmaz Alanlar	10
Tablo 3: Öğrenci Sayıları	10
Tablo 4: Akademik Personel	11
Tablo 5: İdari Personel	12
Tablo 6: Bütçe Gelirleri	14
Tablo 7: Yatırım Programı Proje Finansman Kaynakları	15
Tablo 8: Personel Giderleri	16
Tablo 9: Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Prim Giderleri	17
Tablo 10: Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	18
Tablo 11: Cari Transferler	19
Tablo 12: Sermaye Giderleri	20
Tablo 13: Yatırım Projeleri	23
Tablo 14: Yatırım harcamaları (Ekonomik iki düzeyde)	24
Tablo 15: Derslik ve Merkezi Birimler	25
Tablo 16: Kampüs Altyapısı	27
Tablo 17: Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	28
Tablo 18: Muhtelif İşler (Büyük Onarım)	29
Tablo 19: Muhtelif İşler (Makine- Teçhizat)	30
Tablo 20: Muhtelif İşler (Yazılım)	32
Tablo 21: Bilgi Yönetim Sistemi	33
Tablo 22: Yayın Alımları	35

GRAFİKLER

Grafik 1: Akademik Personel	11
Grafik 2: İdari Personel	12
Grafik 3: 2020 Yılı Bütçe Gelir Durumu	14
Grafik 4: Personel Giderleri	16
Grafik 5: Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Primi Giderleri	17
Grafik 6: Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	18
Grafik 7: Cari Transferler	19
Grafik 8: Sermaye Giderleri	20
Grafik 9: Yatırım Harcama Oranları	24

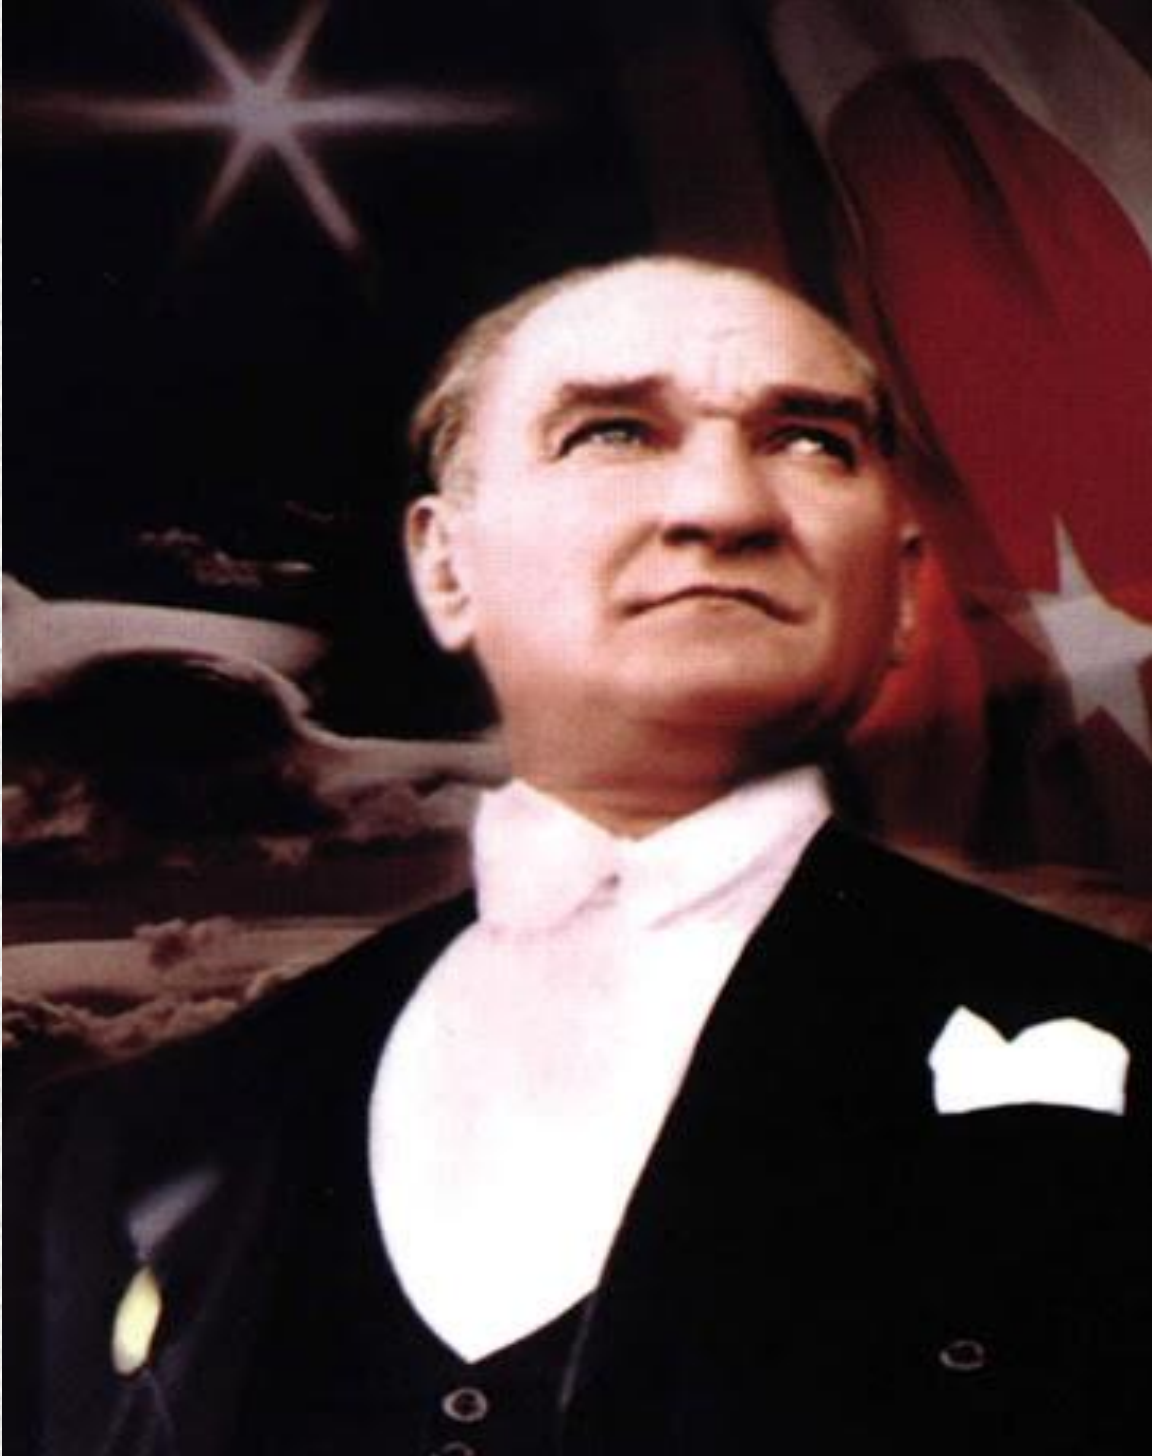

Hissiyatı ve vicdanı telakkiyati, ilim ve fenle besleyip eğiterek toplumun gerçek huzur ve saadetine çalışmak ulvi bir görüştür.

K. Atatürk

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU



Üniversitemiz Mayıs 2018 yılında ekleme/bölünme olmaksızın kurulan araştırma odaklı bir üniversitedir. Kuruluş çalışmaları 2019 yılı itibari ile başlamış olup, yatırım programına 2019 yılı mayıs ayı itibariyle alınmıştır. 2020 yılında eğitim sektöründe 6 adet projesi bulunmakta olup, mevcut yatırım harcamalarının %74,65 lik kısmı üniversitemiz için öncelikli ihtiyaç haline gelen “Derslik ve Merkezi Birimler Projesi” kapsamında harcanmıştır. Yatırım Programına alınan projeler bazında ödenek üstü harcama yapılmamıştır.

Üniversitemizin 2020 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu, 5018 sayılı Kanun’un 25’inci ve 60’ıncı maddeleri ile 5436 sayılı Kanun’un 15’inci maddesine dayanılarak hazırlanan “Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin” 24’üncü maddesi uyarınca hesap verilebilirliği sağlamak ve yatırım harcamalarımızın verimliliğinin kontrol edilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Raporun hazırlanmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, raporu paydaşlarımız ve kamuoyuna saygılarımla sunarım.

Prof. Dr. Mehmet KUL

Rektör

A. GENEL BİLGİLER

A.1. Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

MİSYON

Uygulamalı özgün programlarla donanımlı bireyler yetiştiren, yerel ve küresel düzeyde topluma katkı sağlayan, savunma teknolojileri ve tarım bilimleri başta olmak üzere mühendislik alanlarında ileri teknoloji üreten ve geliştiren; temel değerlere ve bilimin evrensel ilkelerine bağlı, girişimci yeni nesil bir üniversitedir.

VİZYON

Türk Yükseköğretim alanında ve üniversite-sanayi iş birliğinde yenilikçi yaklaşımlarla, akademik birikimi sektöre aktararak bilgiyi ürüne dönüştüren, uluslararası saygınlığa sahip araştırma üniversitesi olmaktır.

TEMEL DEĞERLER

- ✓ Kurumsal aidiyete önem verir,
- ✓ Muasır medeniyetler seviyesine çıkma, hatta onu aşma ilkesine bağlı,
- ✓ Evrensel değerlere bağlı,
- ✓ Milli manevi değerleri temel alan,
- ✓ Fırsat eşitliğine önem veren, farklılıklara karşı hoşgörülü,
- ✓ İnsana ve doğaya duyarlı, sosyal sorumluluk bilincini önemseyen,
- ✓ Tüm süreçlerde yenilikçi yaklaşımlarla kalite odaklı olmayı esas alan,
- ✓ Ulusal ve uluslararası paydaşlarla işbirliğine önem veren, rekabetçi ve girişimci,
- ✓ Katılımcı şeffaf ve hesap verebilirlik ilkelerini esas alan yönetim anlayışı

A.2. Kuruluş Tarihçesi

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmî Gazete’ de 7141 sayılı Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında kurulan 16 Üniversite arasında hiçbir üniversiteden bölünme/eklenme olmaksızın kurulan iki yeni üniversiteden biridir. İlgili Kanunla Üniversitemizde 3 Fakülte, 1 Yabancı Diller Yüksekokulu, 1 Meslek Yüksekokulu ve 1 Enstitü kurulmuş, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN’ın tensipleriyle Rektör ataması 27 Aralık 2018 tarihinde yapılmış ve kuruluş çalışmaları 2019 Ocak ayı itibarıyla başlamıştır.

Üniversitemiz fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve bölümlerine ait kuruluş tarihleri aşağıda ki tabloda verilmiştir.

Tablo 1: Akademik Birimlerin Kuruluş Kronolojisi

BİRİM ADI	AÇILIŞ TARİHİ	AÇILIŞ ŞEKLİ
SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ	18.05.2018	30425 sayılı Resmî Gazete
HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ	18.05.2018	30425 sayılı Resmî Gazete
UZAY MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ	22.05.2019	YÖK Genel Kurulu Kararı İle
UÇAK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ	22.05.2019	YÖK Genel Kurulu Kararı İle
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ	18.05.2018	30425 sayılı Resmî Gazete
SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ (DİSİPLİNLERARASI) (DR)	22.01.2020	YÖK Genel Kurulu Kararı İle
SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ (YL) (TEZLİ)	22.01.2020	YÖK Genel Kurulu Kararı İle
TARIM BİLİMLERİ (YL) (TEZLİ)	08.07.2020	YÖK Genel Kurulu Kararı İle
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ	18.05.2018	30425 sayılı Resmî Gazete
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ	24.04.2019	YÖK Genel Kurulu Kararı İle

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ	24.04.2019	YÖK Genel Kurulu Kararı İle
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ	29.05.2019	YÖK Genel Kurulu Kararı İle
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ	06.11.2019	YÖK Genel Kurulu Kararı İle
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ	29.05.2019	YÖK Genel Kurulu Kararı İle
MÜHENDİSLİK TEMEL BİLİMLERİ BÖLÜMÜ	22.05.2019	YÖK Genel Kurulu Kararı İle
SİVAS MESLEK YÜKSEKOKULU	18.05.2018	30425 sayılı Resmî Gazete
MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ	24.04.2019	YÖK Genel Kurulu Kararı İle
UÇAK TEKNOLOJİSİ PR.	24.04.2019	YÖK Genel Kurulu Kararı İle
TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ	18.05.2018	30425 sayılı Resmî Gazete
BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ	22.05.2019	YÖK Genel Kurulu Kararı İle
BİTKİSEL ÜRETİM VE TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ	24.04.2019	YÖK Genel Kurulu Kararı İle
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU	18.05.2018	30425 sayılı Resmî Gazete
YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ	24.04.2019	YÖK Genel Kurulu Kararı İle

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bölüm ve anabilim dalları; ülkemizin ve bölgemizin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, tüm dış paydaşlarımızın görüş ve önerileri neticesinde, temel mühendislik bilimleri yanı sıra üniversitemiz ihtisaslaşma alanı olarak belirlenen savunma sanayi sektörüne Ar-Ge hizmeti verecek, sektörün talep ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikli eleman ve araştırmacı yetiştirecek şekilde ASELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE, TÜBİTAK UZAY ve TUSAŞ-TAİ gibi alandaki lider savunma şirketleri ile bizzat istişare edilerek belirlenmiş, müfredat içerikleri ve program tasarımı süreci söz konusu kuruluşlarla tasarlanmaya devam etmektedir.

Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi ise, başta T.C. Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili birimleri olmak üzere kamu, özel gıda ve tarım alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla istişare ve iş birliği yapmak sureti ile bir tarım şehri olan Sivas'ta bölgenin ve ülkenin gıda ve tarımsal ürün anlamında kendine yeter ve dış piyasada rekabet edebilecek güce sahip olmak için çözümler üretecek bir Tarımsal Ar-Ge Merkezi olmaya adaydır.

Üniversitemiz Merkezi Derslikler ve Birimleri inşaatı devam etmekte olup geçici hizmet binasında faaliyetlerine başlamıştır. Ancak, akademik, idari, alt yapı vb. kuruluş çalışmaları devam eden Üniversitemiz lisans/Ön lisans düzeyinde eğitim- öğretim faaliyetlerine başlamış olmamasına rağmen lisansüstü düzeyde eğitim – öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

2020 yılı bahar döneminde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde kurulan Savunma Teknolojileri Anabilim Dalında disiplinler arası Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programlarına öğrenci alımı gerçekleştirilmek suretiyle Üniversitemizde eğitim-öğretim lisansüstü düzeyde, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz döneminde de Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde Savunma Teknolojileri Anabilim Dalı tezli yüksek lisans ve doktora programları ile Tarım Bilimleri Anabilim Dalı Tezli yüksek lisans programında lisansüstü düzeyde eğitime başlamıştır.

Fakültelerimiz, Yüksekokulumuz ve Meslek Yüksekokulumuzda lisans/önlisans programlarına öğrenci alımı fiziksel altyapılarının tamamlanmasından sonra gerçekleştirilecektir.

Rektörlük geçici hizmet binası ve akademik ofisler ile laboratuvarlar geçiş aşaması için Cumhuriyet Teknokent kampüsü içinde bulunmaktadır. Üniversitemize tahsis edilen Sivas Fuar Eğitim ve Kongre alanında yapım işi başlayan Derslikler ve Merkezi Birimler Binasının bitmesiyle Üniversitemiz şehir merkezinde kendine ait kampüse taşınmış olacaktır. Kurtderesi Mevkiindeki 840 dönüm Merkez Kampüs alanı imar plan süreci devam etmektedir.

A.3. Taşınmaz Alanlar

Tablo 2: Taşınmaz Alanlar

Yerleşkeler	Taşınmaz Alanların Dağılımı (m ²)	Kapalı Alanların Dağılımı (m ²)
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlük Geçici Bina	-	1.060 m ² (Cumhuriyet Teknokent bünyesinde geçici kullanım tahsisli)
Cumhuriyet Üniversitesi İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (CÜTAM) (Eğitim Amaçlı)	-	1.000 m ² (Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde geçici kullanım tahsisli)
Laboratuvar (İŞGEM) (Eğitim Amaçlı)	-	95 m ² (İŞGEM bünyesinde kiralanmış)
Akademik Ofisler (Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi)	-	603 m ² (Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde geçici kullanım tahsisli)
Üniversitenin Sosyal, Kültürel ve Bilimsel Faaliyetlerinin Gerçekleştirileceği Çok Amaçlı Sosyal Alan	4.440	5.089 m ² (Revize Proje ve Bütçe Talebi Çalışmaları Devam Ediyor)
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İdari Hizmet Binası 1. Etap Projesi	55.370	38.328 m ² (Yapımı Devam Ediyor)
Toplam	59.810 m²	46.175 m²

A.4. Öğrenci Sayıları

Tablo 3: Öğrenci Sayıları

Enstitülerdeki Öğrencilerin Yüksek Lisans (Tezli/ Tezsiz) ve Doktora Programlarına Dağılımı					
Birimin Adı	Programı	Yüksek Lisans Yapan Sayısı		Doktora Yapan Sayısı	Toplam
		Tezli	Tezsiz		
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü	Savunma Teknolojileri ABD	57	-	11	68
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü	Tarım Bilimleri ABD	11	-	-	11
Toplam		68		11	79


A.5. Personel Sayıları

A.5.1. Akademik Personel

Tablo 4: Akademik Personel

Akademik Personel		
	2019	2020
Profesör	3	4
Doçent	-	5
Dr. Öğr. Üyesi	1	19
Öğretim Görevlisi	-	5
Okutman	-	-
Araştırma Görevlisi	7	33
Uzman	-	-
Çevirici	-	-
Toplam	11	66

Grafik 1: Akademik Personel

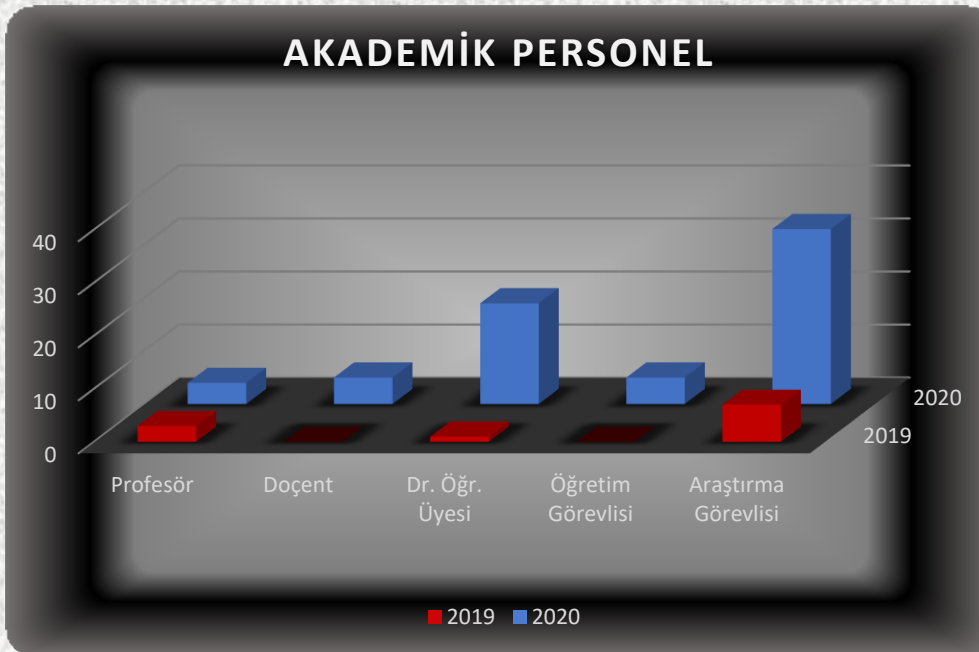


A.5.2. İdari Personel

Tablo 5: İdari Personel

İdari Personel (Kadrolu-Sözleşmeli Pozisyonu- Sürekli İşçi Pozisyonu)		
	2019	2020
Genel İdari Hizmetler	11	24
Sağlık Hizmetleri	0	0
Teknik Hizmetler	4	10
Eğitim ve Öğretim Hizmetleri	0	0
Avukatlık Hizmetleri	0	0
Din Hizmetleri	0	0
Yardımcı Hizmetler	0	2
Sözleşmeli	0	0
Sürekli İşçi	19	25
Toplam	34	61


Grafik 2: İdari Personel

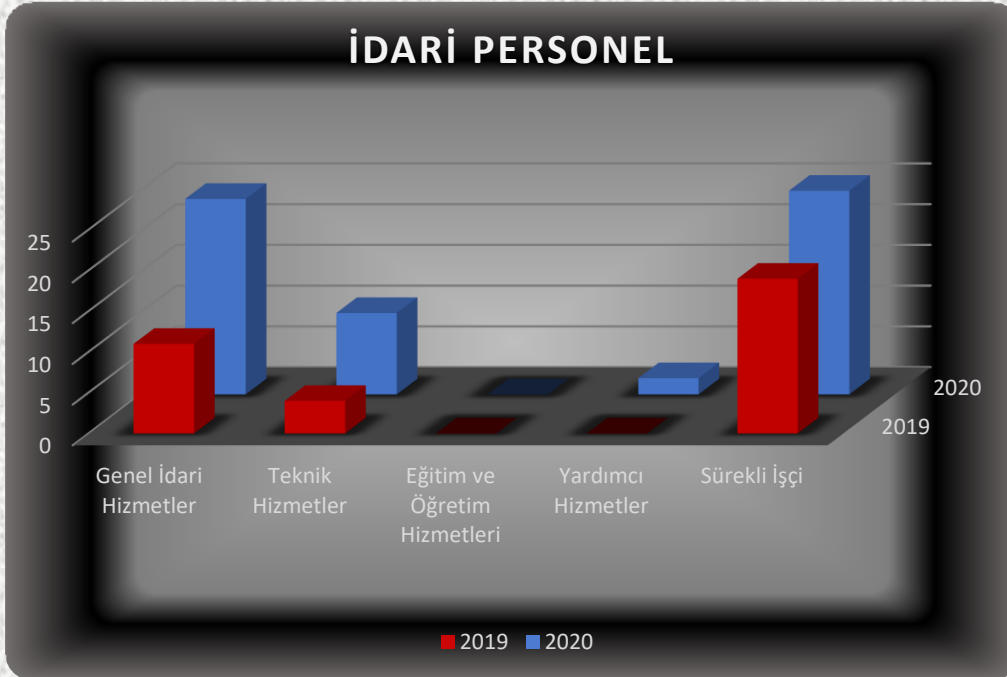

A.6. Örgüt Yapısı

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin akademik ve idari organizasyon şeması aşağıda sunulmuştur.

SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ORGANİZASYON ŞEMASI

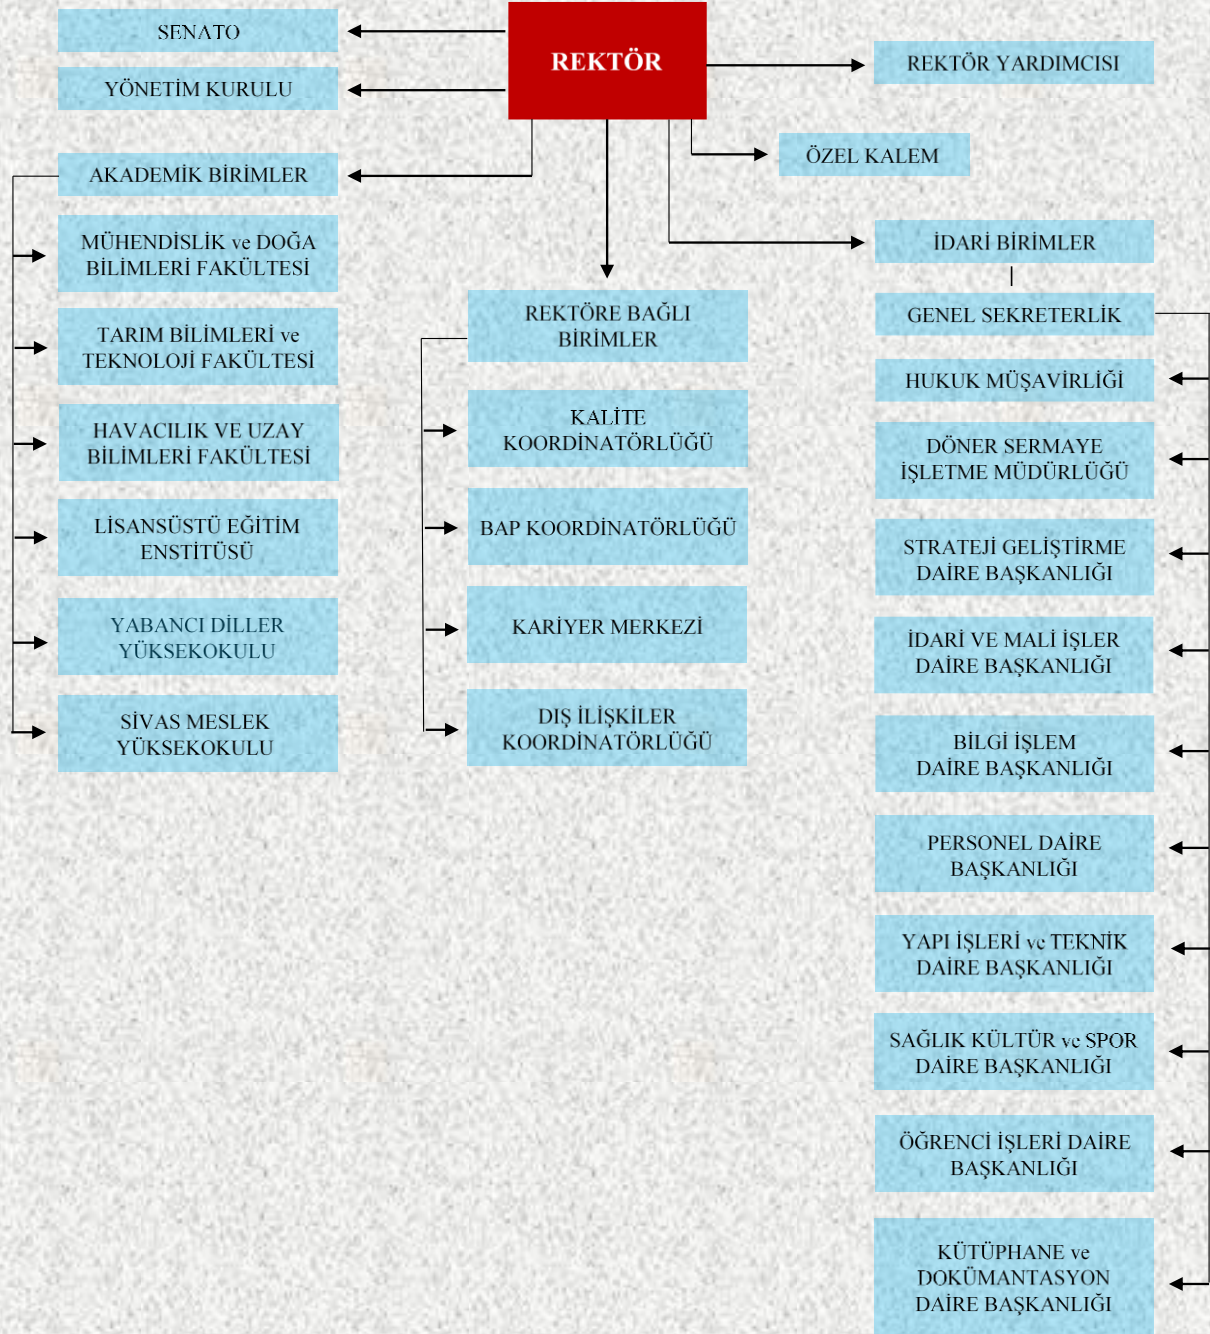

B. KURULUŞUN FİNANSMAN KAYNAKLARI

B.1. Bütçe Gelirleri

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun (II) Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin (A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup, Özel Bütçeli bir kurumdur.

Gelirlerimiz; Hazine Yardımı, Öz Gelirler, Bağış ve Yardımlar, Bütçe Dışı Kaynaklardan oluşmaktadır.

Tablo 6: Bütçe Gelirleri

GELİR AÇIKLAMASI	PLANLAN GELİR (TL)	GERÇEKLEŞEN GELİR (TL)
03- TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	0	7.060
04-2 HAZİNE YARDIMLARI	20.003.000	27.164.050
04.4- ŞARTLI BAĞIŞ VE YARDIMLAR	0	3.500
05-DİĞER GELİRLER	344.000	230.545
TOPLAM	20.347.000	27.405.155

Grafik 3: 2020 Yılı Bütçe Gelir Durumu



B.2. Kuruluşun Yatırım Programı Proje Finansman Kaynakları

Üniversitemiz yatırımları 2020 KBÖ 11.000.000 TL olup, yıl sonu ödeneği 16.399.953 TL ye ulaşmıştır. Yatırım finansman kaynaklarımızın %97,56 lık kısmını hazine yardımları oluştururken %2,44 lük kısmını öz gelirlerimiz oluşturmaktadır. Yatırım programı kapsamında proje ödeneklerinde mevcut ödenekleri kullanılarak, ödenek üstü harcama gerçekleşmemiştir.

Tablo 7: Yatırım Programı Proje Finansman Kaynakları

Proje No	Proje Adı	2020 Yıl Sonu Ödeneği (TL)	Hazine (TL)	Öz Gelir (TL)	Diğer
2019H03-134610	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	200.000	200.000	-	-
2020H03-151902	Kampüs Altyapısı	500.000	500.000	-	-
2020H03-151910	Derslik ve Merkezi Birimler (Merkez Derslik 1. Etap Projesi)	12.500.000	12.500.000	-	-
2020H03-151888	Muhtelif İşler	2.799.953	2.400.000	399.953	-
2020H03-151892	Yayın Alımı	50.000	50.000	-	-
2020H03-153210	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi	350.000	350.000	-	-


B.3. Bütçe Giderleri

Üniversitemiz 2019 ve 2020 yıllarına ait ekonomik bazda ödenekler ve harcamaları aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.

Tablo 8: Personel Giderleri

01-Personel Giderleri					
Yılı	KBÖ (TL)	Eklenen (TL)	Düşülen (TL)	Yıl Sonu Net Ödenek (TL)	Harcama (TL)
2019	-	883.250	-	883.250	499.546
2020	3.883.000	4.417.680	445.400	7.855.280	7.809.594


Grafik 4: Personel Giderleri

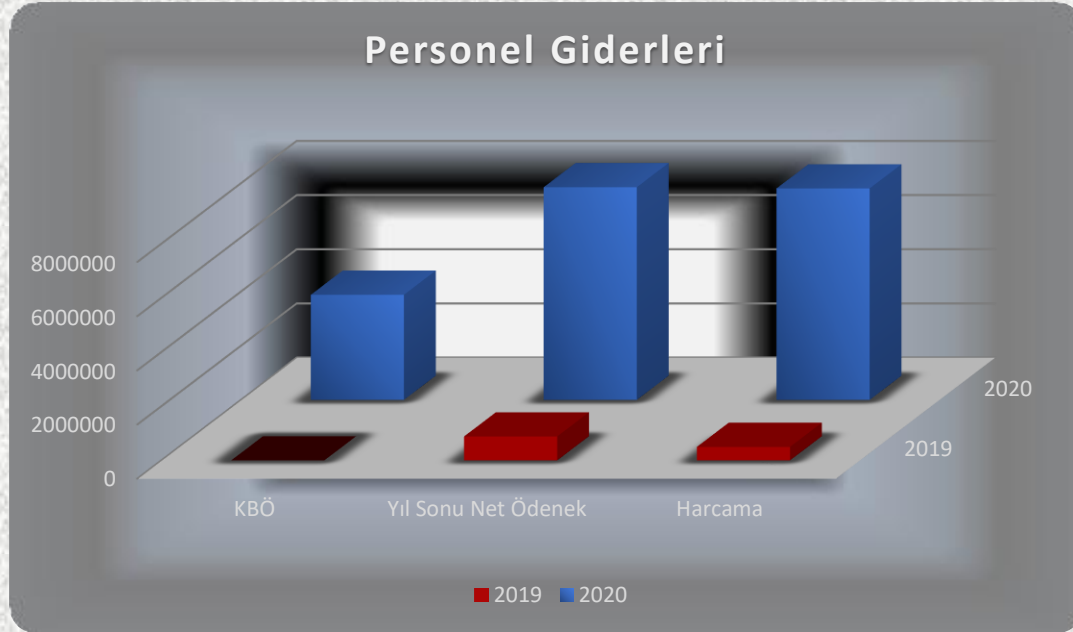

Tablo 9: Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Prim Giderleri

02-Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Prim Giderleri					
Yılı	KBÖ (TL)	Eklenen (TL)	Düşülen (TL)	Yıl Sonu Net Ödenek (TL)	Harcama (TL)
2019	-	197.800	-	197.800	74.245
2020	221.000	905.460	14.000	1.112.460	1.110.290

Grafik 5: Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Primi Giderleri

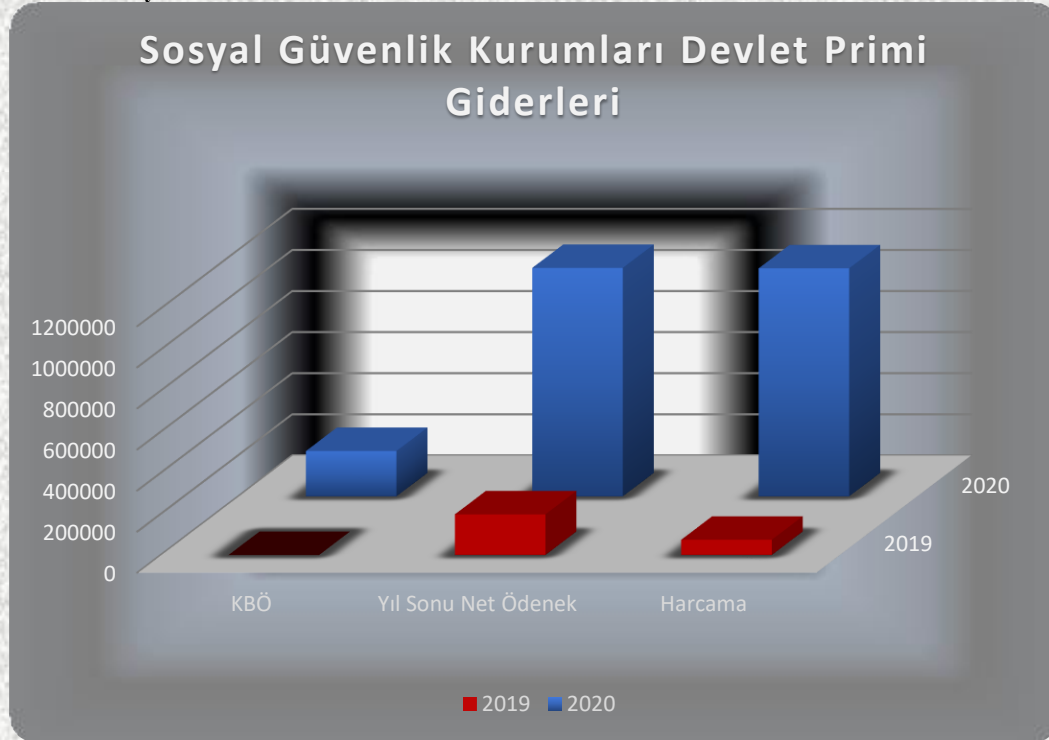

Tablo 10: Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri					
Yılı	KBÖ (TL)	Eklenen (TL)	Düşülen (TL)	Yıl Sonu Net Ödenek (TL)	Harcama (TL)
2019	-	2.380.000	-	2.380.000	1.467.863
2020	5.000.000	83.000	826.000	4.257.000	3.633.666

Grafik 6: Mal ve Hizmet Alımı Giderleri



Tablo 11: Cari Transferler

05-Cari Transferler					
Yılı	KBÖ (TL)	Eklenen (TL)	Düşülen (TL)	Yıl Sonu Net Ödenek (TL)	Harcama (TL)
2019	-	-	-	-	-
2020	243.000	-	-	243.000	159.296


Grafik 7: Cari Transferler



Tablo 12: Sermaye Giderleri

06-Sermaye Giderleri					
Yılı	KBÖ (TL)	Eklenen (TL)	Düşülen (TL)	Yıl Sonu Net Ödenek (TL)	Harcama (TL)
2019	-	4.300.000	-	4.300.000	3.900.047
2020	11.000.000	6.294.953	895.000	16.399.953	10.238.328

Grafik 8: Sermaye Giderleri

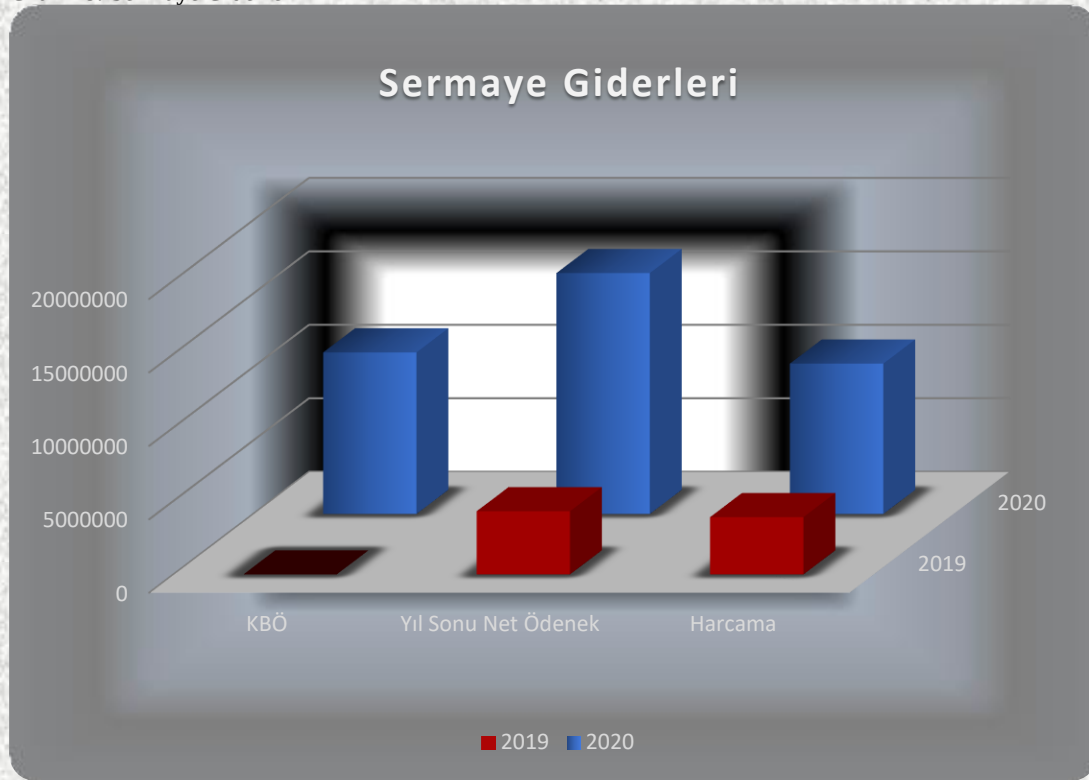

C. 2020 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI

Üniversitemizin 2020 yılı yatırım programında toplam altı adet projesi bulunmaktadır. Yatırım programında yer alan projelerinin tamamı eğitim sektöründe yer almaktadır. Mevcut projelerimiz, Muhtelif İşler, Yayın Alımı, Bilgi Yönetim Sistemleri, Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi, Derslikler ve Merkezi Birimler Merkez Derslik 1. Etap Projesi, Kampüs Altyapısı, olup, yılı içerisinde proje işlemleri gerçekleşmiştir.

Herhangi bir üniversiten ekleme/ bölünme olmaksızın kurulan üniversitemizin kuruluş çalışmaları halen devam etmektedir. Strateji Bütçe Başkanlığınca desteklenen yatırım projeleri kapsamında;

2020 yılında projelerimizden Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında ihale yapılmış, ihale sonucunda teslim tarihi 2022 yılı nisan ayı olarak belirlenmiştir. Ancak yerleşkemizin de faaliyete geçirilmesi için 2020 yılı içerisinde yatırımları hızlandırma ödeneği talep edilmiş, söz konusu talep Cumhurbaşkanlığı makamınca uygun görülmüştür. Bu kapsamda iş planı revize edilerek 2021 yılı eylül ayı olarak teslim tarihi planlanmıştır.

Üniversitemizin eğitim öğretim, araştırma geliştirme ve diğer faaliyetlerini yürütebilmesi için muhtelif işler projesi kapsamında makine teçhizat alımlarında öncelikli ve önemli ihtiyaçları için tespit çalışmaları yapılmış ve alımlar gerçekleştirilmiştir. Ayrıca laboratuvarların, kurumumuza geçici tahsisi yapılan rektörlük binası ile 38 odanın bakım onarımı yapılmıştır. Proje yazılım karakteristiğinde bulunan mevcut ödeneği ile elektronik sertifika ve mini kart, antivirüs yazılım alımları ile program yazılım alımları gerçekleştirilmiştir.

Bilgi yönetim sistemleri ile verilerin toparlanması, arşivlenmesi ve bunların standartlaştırılabilmesi için proje kapsamında İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ile sözleşme imzalanmıştır.

Henüz bir yerleşkesinin olmaması ve Cumhuriyet Üniversitesi Teknokentte konuşlandırılan üniversitemizin kütüphanesi olmayıp, kütüphane kaynakları kısıtlıdır. Yerleşkemize taşınmakla birlikte kütüphanemiz, elektronik basılı koleksiyonlarımız çeşitliliği artırılabilecektir.



D. YATIRIM PROJE UYGULAMALARI

Üniversitemiz 2020 Yılında Yatırım Programı eğitim sektörü altında 6 adet proje ile yer almıştır. Yatırım projelerimizin KBÖ ödeneği 11.000.000 TL olup, Derslik ve Merkezi Birimler Projesine yılı içerisinde 5.000.000 TL, Muhtelif İşler Projesinde “makine ve teçhizat” karakteristiğine 399.953 TL net finansman fazlasından ödenek kaydı yapılarak yıl sonu ödeneğimiz 16.399.953 TL’ ye ulaşmıştır. Mevcut ödeneğin 10.238.328 TL’lik kısmı harcanmıştır.


Tablo 13: Yatırım Projeleri

Sıra No	Proje No	Proje Adı	Proje Sahibi	Proje Yürütücüsü
1	2019H03-134610	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	SBTÜ	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
2	2020H03-151902	Kampüs Altyapısı	SBTÜ	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
3	2020H03-151910	Derslik ve Merkezi Birimler (Merkez Derslik 1. Etap Projesi)	SBTÜ	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
4-1	2020H03-151888	Muhtelif İşler (Büyük Onarım)	SBTÜ	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
4-2	2020H03-151888	Muhtelif İşler (Yazılım)	SBTÜ	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
4-3	2020H03-151888	Muhtelif İşler (Makine-Teçhizat)	SBTÜ	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
5	2020H03-151892	Yayın Alımı	SBTÜ	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
6	2020H03-153210	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi	SBTÜ	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Tablo 14: Yatırım harcamaları (Ekonomik iki düzeyde)

PROJE ADI	EKONOMİK KOD (İKİ DÜZEY)	2020 YILI ÖDENEĞİ (TL)	EKLENEN (TL)	DÜŞÜLEN (TL)	2020 YILI GÜNCEL PROJE TUTARI (TL)	2020 HARCAMASI (TL)
ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ	06.5	500.000	-	-	500.000	-
KAMPÜS ALTYAPISI	06.5	200.000	-	-	200.000	-
DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER MERKEZ DERSLİK 1. ETAP PROJESİ	06.5	7.500.000	5.000.000	-	12.500.000	7.642.669,94
MUHTELİF İŞLER (MAKİNE TEÇHİZAT)	06.1	1.450.000	1.044.953	-	2.494.953	2.034.362
MUHTELİF İŞLER (BİLGİSAYAR YAZILIM)	06.3	180.000	-	30.000	150.000	54.435
MUHTELİF İŞLER (BÜYÜK ONARIM)	06.7	800.000	-	645.000	155.000	152.932
YAYIN ALIMİ	06.1	50.000	-	-	50.000	11.755
ÜNİVERSİTE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ	06.3	320.000	30.000	-	350.000	342.175
TOPLAM		11.000.000	6.074.953	675.000	16.399.953	10.238.328

Grafik 9: Yatırım Harcama Oranları

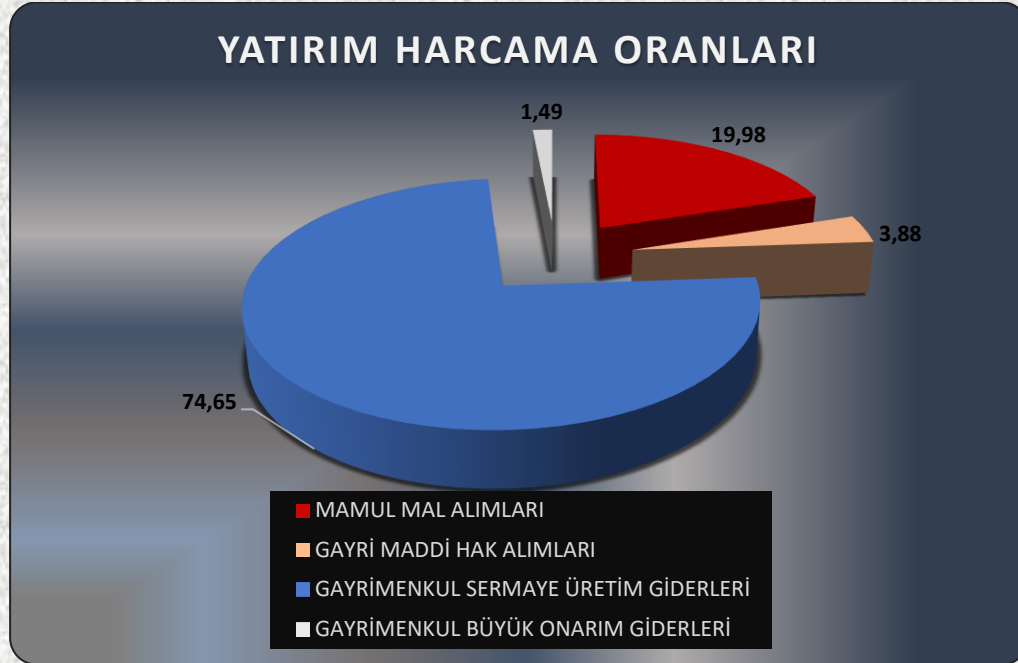

D.1. Devam Eden Projeler

Tablo 15: Derslik ve Merkezi Birimler

PROJENİN ADI	DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER
PROJENİN NUMARASI	2020H03-151910
SEKTÖRÜ	EĞİTİM
PROJE BAŞLAMA YILI	2020
PROJE BİTİŞ YILI	2022
KARAKTERİSTİĞİ	Eğitim (16.325 m ²)
ALT KARAKTERSTİĞİ	Üniversitemiz Rektörlük Hizmet Binası- Merkezi Derslikler İnşaatı
PROJE BÜTÇESİ (TL)	33.000.000
2020 YILI BÜTÇESİ (TL)	7.500.000
EKLENEN (TL)	5.000.000
DÜŞÜLEN (TL)	-
2020 YILI TOPLAM ÖDENEĞİ (TL)	12.500.000
HARCANAN (TL)	7.642.670
PROJEYE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME	Projenin bitiminde Üniversitemiz kendine ait bir kampüs alanı ve fiziki yapıya, Savunma Sanayiye katkı sağlayacak teknolojik donanımına sahip laboratuvarlar tamamlanmış olacaktır. Sosyal çevre ve ulaşım avantajıyla daha iyi bir konumda bulunacaktır. Ülkemizin ulusal kalkınma ve özellikle ulusal güvenliği ilgilendiren alanlarda dışa bağımlılığa son verip uluslararası rekabette hak ettiği yeri alması için gerçekleştirilen ulusal düzeydeki çalışmaları akademik düzeyde yürütecek olan Üniversitemizin, fiziki mekân ihtiyacını karşılayacaktır. Mimari Proje İmalatları, Statik Proje İmalatları, Mekanik Tesisat, Elektrik Tesisat, Bina karkas halinde teslim alındığı için, projeye uyumlayan ölçü ve yapı elemanları tespit edilmiş olup, uygulama aşamasında fen ve sanat kurallarına uygun hale getirilmiştir. Mekanik ve Elektrik Tesisatında; Mekanikte bulunan havalandırma-ısıtma Tesisatı proje üzerinde, Elektrik Tesisatında bulunan kuvvetli-zayıf akım taşıma konsollarıyla aynı yerde bulunmaktadır. Uygulama aşamasında fen ve sanat kurallarına göre uygun yerlere montajı yapılmıştır. İhtiyaç duyulan tüm mal ve hizmetler 4734 sayılı KİK çerçevesinde çözülerek temin edilmiş bu manada herhangi bir sorunla karşılaşılmamıştır. Uygulama projesini inceleme süresi kısıtlı olması sebebiyle, bu sorunlarla karşılaşmıştır. Yeni projelerde yeterli zaman sağlandığı takdirde, bu eksiklikler minimize edilecektir.

Derslik ve Merkezi Birimler Merkez Derslik 1. Etap İnşaatı Proje Yapım Aşaması Görselleri



Tablo 16: Kampüs Altyapısı

PROJENİN ADI	KAMPÜS ALTYAPISI
PROJENİN NUMARASI	2020H03-151902
SEKTÖRÜ	EĞİTİM
PROJE BAŞLAMA YILI	2020
PROJE BİTİŞ YILI	2022
KARAKTERİSTİĞİ	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon Hattı, Peyzaj, Su İsale Hattı, Telefon Hattı
ALT KARAKTERİSTİĞİ	Üniversitemiz Rektörlük Hizmet binası inşaat alanı alt yapı çalışmaları
PROJE BÜTÇESİ (TL)	600.000
2020 YILI BÜTÇESİ (TL)	200.000
EKLENEN (TL)	-
DÜŞÜLEN (TL)	-
2020 YILI TOPLAM ÖDENEĞİ (TL)	200.000
HARCANAN (TL)	-
PROJEYE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME	Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin şehirdeki eğitim/öğretim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Üniversite kampüs alanı olarak kullanılacaktır. Üniversite bünyesinde kurulması planlanan fakültelerin tarım, mühendislik, doğa bilimleri vb. bu fakültelerin Sivas kentinin sembol yapılarına ve özgün kent silüetine hâkim bir noktada kurulacak olması ve bu durumun ise öğrencilerin kentte ve üniversiteye olan aidiyet duygusunu geliştireceği, kent makro formunda; eğitim, kültür, sanat, sosyal aktiviteler yönünden bölgenin cazibe merkezi olarak ulaşılabilirliğini yükseltecek ve kent gelişimine olumlu yönde katkı sağlayacaktır. Üniversite Yer Seçim Kurulunun 18.04.2019 – 1 tarih ve sayılı kararı ile Sivas İli, Merkez İlçesi Kadı Burhanettin Mahallesi 371 ada 134 parselin Üniversite kurulması amacına uygun olduğuna ve Maliye Hazinesi adına kayıtlı bu taşınmazın Üniversiteye tahsis edilmesinin uygun olduğuna karar verilmiştir. İlgili ihtiyaç tespitleri, fizibilite çalışmaları kapsamında proje çalışmaları yapılmaktadır. Üniversite kampüs alanının içinde yapılacak peyzaj düzenlemesinin ve çevre duvarlarının dışında kalan alandaki yollar, kaldırım ve peyzaj düzenlemelerinin yapılması ile Üniversite kampüs alanının çevre yollarının düzenlenmesi ile su, kanalizasyon, elektrik, telefon ve internet altyapılarının yapılması planlanmıştır. Kampüs alan peyzajında kullanılacak aydınlatmaların yapılması ve çevre yollarının aydınlatmalarının yapılması için Kamu Kurum ve Kuruluşlarının koordinasyonuna ihtiyaç duyulmaktadır.

D.2. Tamamlanan Projeler

Tablo 17: Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (TL)						
			Yatırım Programına Alınış Değerleri		Revize Edilmiş Son Değerler	
Proje No	2021H03-168056		500.000		500.000	
Proje Adı	ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ					
Sektör/Altsektör	Eğitim					
Proje Amacı	Üniversitenin Sosyal, Kültürel ve Bilimsel Faaliyetlerinin Gerçekleştirileceği Çok Amaçlı Sosyal Alan					
Proje Yeri	Merkez / Sivas					
Karakteristiği	Betonarme Yapı					
Başlama ve Bitiş Tarihi	2019-2020					
Proje Sözleşme Tarihi			Sözleşme İhale Bedeli			
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
					-	
Yıllar İtibariyle Yapılan Harcama						
Cari Fiyatlarla			2020 Yılı Fiyatlarıyla			
	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl					-	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Projenin bitiminde Üniversitemize ait, Lojman ve Üniversitenin sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyetlerini gerçekleştirileceği çok amaçlı sosyal alana sahip olacaktır.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	Uluslararası alanda tanınırlığı olan etkinliklerin bölgede gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.					
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Merkez İlçe, İşhan Köyünde bulunan mülkiyeti Hazineye ait 4440 m ² yüzölçümlü 5089 m ² kapalı alana sahip 5129 ada 1 parsel numaralı taşınmazın 02.02.2020 tarihinde Üniversitemize kesin tahsisi yapılmıştır.					
	Üniversitemize tahsis edilen söz konusu taşınmaz, arşiv ve depo olarak kullanılmaktadır. Ancak, Üniversitemiz ihtiyaçları çerçevesinde çok amaçlı sosyal alan olarak kullanılabilmesi için, büyük çaplı bakım-onarım ihtiyacı vardır.					
	Söz konusu taşınmazın, Üniversitemiz ihtiyaçları çerçevesinde çok amaçlı sosyal alan olarak kullanılabilmesi için gerekli olan bakım-onarım maliyet çalışmaları yapılmıştır.					
	İhtiyaç duyulan bakım onarım giderlerine ilişkin Üniversitemiz ilgili bütçe tertibinde yeterli ödenek bulunmadığından, kamu/özel kurum ve kuruluşların desteğine ihtiyaç duyulmaktadır.					

Tablo 18: Muhtelif İşler (Büyük Onarım)

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (TL)						
				Yatırım Programına Alınış Değerleri		Revize Edilmiş Son Değerler
Proje No	2020H03-151888			800.000		155.000
Proje Adı	MUHTELİF İŞLER					
Sektör/Altsektör	Eğitim					
Proje Amacı	Bina Bakım Onarım					
Proje Yeri	Merkez/Sivas					
Karakteristiği	Büyük Onarım					
Başlama ve Bitiş Tarihi	2020-2020					
Proje Sözleşme Tarihi			Sözleşme İhale Bedeli			
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
Yıllar İtibariyle Yapılan Harcama						
Cari Fiyatlarla				2020 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl					152.932	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Proje kapsamında yapılan bakım onarım ile Üniversitemize tahsis edilen binalarda bakım onarım yapılmıştır.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	Üniversite eğitim/öğretim ve araştırma/geliştirme diğer yürüttüğü faaliyetlerinin daha etkin ve kaliteli hale getirilmesi hedeflenmektedir.					
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Üniversitemiz İdari hizmet binası 1. Etap yapım işi için performans analizi ve güçlendirme, rektörlük binası idari bina inşaat alanında yapılacak olan bakım onarımları için muhtelif inşaat malzemesi, laboratuvarların bakım onarımı, rektörlük binasında bulunan teras bakım onarımı Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi A ve B binalarından kurumumuza tahsis edilen 38 adet odanın bakım onarımında kullanılacak inşaat malzemesi alımı ve bakım-onarım kapsamında muhtelif işler inşaat malzemesi alımı gerçekleştirilmiştir.					

Tablo 19: Muhtelif İşler (Makine- Teçhizat)

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (TL)						
				Yatırım Programına Alınış Değerleri	Revize Edilmiş Son Değerler	
Proje No	2020H03-151888			1.450.000	2.494.953	
Proje Adı	MUHTELİF İŞLER					
Sektör/Altsektör	Eğitim					
Proje Amacı	Makine-Teçhizat					
Proje Yeri	Merkez/Sivas					
Karakteristiği	Makine -Teçhizat					
Başlama ve Bitiş Tarihi	2020-2020					
Proje Sözleşme Tarihi			Sözleşme İhale Bedeli			
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
Yıllar İtibariyle Yapılan Harcama						
Cari Fiyatlarla				2020 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl					2.034.362	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Yeni kurulan bir üniversite olduğumuz için, akademik ve idari personelin büro işyeri makine teçhizat ve tefrişat ihtiyaçlarının karşılanması sonucu akademik-idari çalışmalara hızlı bir şekilde başlanılmıştır. Yüksek lisans ve doktora programları ile eğitim ve öğretime başlayan Üniversitemizde gerekli olan derslik ve laboratuvar altyapısının kurulması planlanmış ve sonucunda kaliteli eğitim ve öğretim hizmeti hedef olarak seçilmiştir.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	Üniversite eğitim/öğretim ve araştırma/geliştirme ile diğer yürüttüğü hizmet faaliyetlerinin daha etkin ve kaliteli hale getirilmesi hedeflenmektedir.					
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Yeni kurulan bir Üniversite olarak özellikle satın alma ve ihale konularında nitelikli personel alma sıkıntısı, ihale sürecinde ilan süreleri, alınacak cihaz-malzemelerin teknik şartnamelerinin istenilen nitelikte hazırlanamaması, ihalelere yönelik şikayetler, ihale komisyonlarında görev alacak personelin bu süreçler ile ilgili bilgi düzeyi satın alma süreçlerine olumsuz etki yapmaktadır.					



Tablo 20: Muhtelif İşler (Yazılım)

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (TL)						
				Yatırım Programına Alınış Değerleri		Revize Edilmiş Son Değerler
Proje No	2020H03-151888			180.000		150.000
Proje Adı	MUHTELİF İŞLER					
Sektör/Altsektör	Eğitim					
Proje Amacı	Yazılım					
Proje Yeri	Merkez/Sivas					
Karakteristiği	Bilgisayar Yazılım					
Başlama ve Bitiş Tarihi	2020-2020					
Proje Sözleşme Tarihi			Sözleşme İhale Bedeli			
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
Yıllar İtibariyle Yapılan Harcama						
Cari Fiyatlarla				2020 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl					54.435	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Gerçekleşen yazılım alımları ile tüm faaliyet alanlarında aksama yaşanmadan daha sağlıklı bir şekilde hizmet edilmesi.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	Üniversite eğitim/öğretim ve araştırma/geliştirme ile diğer yürüttüğü hizmet faaliyetlerinin daha etkin ve kaliteli hale getirilmesi hedeflenmektedir.					
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Yılı içerisinde üniversitemizin 3 yıllık nitelikli elektronik sertifika ve mini kart okuyucu alımı, internet ve mevzuat destekli personel ve insan kaynakları programı alımı ödemesi, antivirüs yazılımı alımları vb. gibi alımlar gerçekleştirilmiştir.					

Tablo 21: Bilgi Yönetim Sistemi

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (TL)						
				Yatırım Programına Alınış Değerleri		Revize Edilmiş Son Değerler
Proje No	2020H03-153210			320.000		350.000
Proje Adı	BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ					
Sektör/Altsektör	Eğitim					
Proje Amacı	Yazılım Donanım Kurulumu					
Proje Yeri	Merkez /Sivas					
Karakteristiği	BİT, Danışmanlık, Makine -Teçhizat, Müşavirlik/Kontrollük					
Başlama ve Bitiş Tarihi	2020-2020					
Proje Sözleşme Tarihi			Sözleşme İhale Bedeli			
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
Yıllar İtibariyle Yapılan Harcama						
Cari Fiyatlarla				2020 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl					342.175	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	UBYS alımı gerçekleştirilerek, hizmette verimliliği ve etkinliği artırmak.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	Üniversite eğitim/öğretim ve araştırma/geliştirme ile diğer yürüttüğü hizmet faaliyetlerinin daha etkin ve kaliteli hale getirilmesi hedeflenmektedir.					
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	4734 sayılı Kamu İhale Kanunun ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu çerçevesinde; Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ve İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi arasında Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi Teknik Destek alımı adı altında imzalanan sözleşmeye istinaden 2020 yılı ÜBYS yazılım ve teknik destek alımı yapılmıştır.					

The screenshot displays the ÜBYS (University Information Management System) web interface. The top navigation bar includes the university's name and logo. The sidebar on the left lists various system modules such as 'Sistem Yönetimi', 'DİLEK ÖNERİ ŞİKAYET', 'STRATEJİK YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ', 'Organizasyon Yönetimi', 'MOBİL YÖNETİM SİSTEMİ', 'İÇ KONTROL SİSTEMİ', 'AYRILIŞ SÜREÇ TAKİBİ SİSTEMİ', 'UZAKTAN EĞİTİM', 'KURUMSAL DEĞERLENDİRME SİSTEMİ', 'KİŞİSEL MEMUR İŞLEMLERİ', 'ÖĞRETİM ELEMANI SİSTEMİ', 'ÖĞRENCİ SİSTEMİ', 'ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ', 'FİRMA KAYIT İŞLEMLERİ', 'YABANCI DİLLER', 'Uluslararası Öğrenci Başvuru Takip Ekranı', 'UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ', 'EK DERS MODÜLÜ', 'ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ', 'AKADEMİK PERFORMANS BİLGİ SİSTEMİ', 'BAP İŞLEMLERİ', and 'BAP İŞLEMLERİ'. The main content area features a 'Yapılacaklar' (To Do) section with a task related to '2100001890 numaralı, Görevlendirme (Hizmetliçi Eğitim) konulu belge dolaşımı tamamlanmıştır. Bu' and a 'Duyurular' (Announcements) section. The footer includes social media links for Facebook, Twitter, and YouTube, and contact information for the university.



Tablo 22: Yayın Alımları

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (TL)						
				Yatırım Programına Alınış Değerleri	Revize Edilmiş Son Değerler	
Proje No	2020H03-51892			50.000	50.000	
Proje Adı	YAYIN ALIM					
Sektör/Altsektör	Eğitim					
Proje Amacı	Yayın Alımı					
Proje Yeri	Merkez /Sivas					
Karakteristiği	Basılı- Elektronik Yayın Alımı					
Başlama ve Bitiş Tarihi	2020-2020					
Proje Sözleşme Tarihi			Sözleşme İhale Bedeli			
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
Yıllar İtibariyle Yapılan Harcama						
Cari Fiyatlarla				2020 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl					11.755	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Kuruluş çalışmaları halen devam eden üniversitemizin eğitim öğretim araştırma geliştirme faaliyetlerinde önemli bir yeri olan kütüphane kaynaklarının oluşturulması.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	Üniversite eğitim/öğretim ve araştırma/geliştirme ile diğer yürüttüğü hizmet faaliyetlerinin daha etkin ve kaliteli hale getirilmesi hedeflenmektedir.					
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Üniversitemiz kütüphane kaynakları için mevcut ödenekleri kapsamında basılı yayın (kitap) alımı gerçekleştirilmiştir. Bütçe ödeneginin yeterli düzeyde olmayışı, e-kaynakların çoğunlukla döviz cinsi üzerinden ödenmesi ve döviz artışının tahmin edilenden fazla yükselmesi basılı kaynak alımını etkilemekte, basılı kaynaklarda hedeflenen sayıya ulaşamamaktadır					

E. YATIRIM PROJE UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÖNERİLER

Nitelikli ve alanında deneyimli personel eksikliğinin giderilmesi ile iş ve işlemlerin daha sağlıklı bir şekilde yürüyeceği düşünülmektedir.

Yatırım ödeneklerinin Ayrıntılı Finansman Programında vize aşamasında idare koşullarının ve gereklerinin dikkate alınması büyük önem arz etmektedir.

Yeni kurulan Üniversitelerin yatırım bütçe tekliflerindeki reel taleplerinin mümkün olduğunca karşılanması, bu üniversitelerin fiziksel kapasitelerini daha hızlı geliştirmelerini sağlayacaktır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre yapılan ihalelerde ihale süreçlerinin uzunluğu, yapılan yatırımların istenilen zamanda bitirilmemesine ve planlanan yatırımlarda sapmalara neden olmaktadır. İhale mevzuatında buna yönelik bazı değişiklikler yapılmasının sorunun çözümünde etkili olacağı düşünülmektedir.

SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2020 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ

BÜTÇE TÜRÜ: İÇMAL																			
SEKTÖR	PROJE SAYISI	PROJE TUTARI		2019 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA				2020 YILI PROGRAM ÖDENEK				2020 YILI REVİZE ÖDENEK				2020 YILI BAŞINDAN DÖNEM SONUNA KADAR NAKDİ GERÇEKLEŞME			
				DİŞ		TOPLAM	DİŞ		TOPLAM	DİŞ		TOPLAM	DİŞ		TOPLAM	DİŞ		TOPLAM	
																			KREDİ
TARIM																			
MADENCİLİK																			
İMALAT																			
ENERJİ																			
ULAŞTIRMA-HAB.																			
TURİZM																			
KONUT																			
EĞİTİM	6		38.900.000			2.000.000			11.000.000			16.399.953					10.238.328		
SAĞLIK																			
DIŞ KAMU HİZM.																			
İKTİSADİ																			
SOSYAL																			
TOPLAM	6	0	38.900.000	0	0	2.000.000	0	0	11.000.000	0	0	16.399.953	0	0	0	0	10.238.328		



**SİVAS
BİLİM VE TEKNOLOJİ
ÜNİVERSİTESİ**



/sivasbtu



/sivas.btu
